



**FONDS D'INTERVENTION
POUR LE DEVELOPPEMENT**
MADAGASCAR

PROJET FILETS SOCIAUX DE SECURITE (FSS)

**AGENCE DE MISE EN OEUVRE : FONDS D'INTERVENTION POUR LE DEVELOPPEMENT
(FID)**

**RAPPORT DE SUIVI DES ACTIVITES
Du Projet Filets Sociaux de Sécurité
Financement Additionnel 2
Don IDA –D4340 MG**

Janvier à juin 2020

Aout 2020

LISTE DES ACRONYMES

ACT	Argent Contre Travail
ACT-PC	Argent Contre Travail- Post Catastrophe
AGEC	Agence d'Encadrement des Travaux
AGEX	Agence d'exécution
AS	Accompagnateurs Spécialisés
BNGRC	Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes
CP	Chargé de Projet
CPS	Comité de Protection Sociale
DEPA	Direction de l'Education Préscolaire et l'Alphabétisation
DIRA	Direction Interrégionale de Toamasina
DIRF	Direction Interrégionale de Fianarantsoa
DIRT	Direction Interrégionale d'Antananarivo
DIRK	Direction Interrégionale de Manakara
DIRU	Direction Interrégionale de Toliara
DPE	Développement de la Petite Enfance
DPEI	Développement de la Petite Enfance Intensifiée
DRAEP	Direction Régionale de l'Agriculture de l'Elevage et de la Pêche
EBE	Espaces de Bien-Etre
EPI	Equipe de Protection Individuelle
FA1	Financement Additionnel 1
FA2	Financement Additionnel 2
FID	Fonds d'Intervention pour le Développement
FR	Fonds de Redressement
FSP	Filets Sociaux Productifs
FS	Fonds de Soutien
FSS	Filets Sociaux de Sécurité
GT	Groupes de Travail
Ha	Hectare (Unité de mesure de surface)
HIMO	Haute Intensité de Main d'Œuvre
IDA	Association Internationale de Développement
IPC4	Indice de Prix à la Consommation 4
MACC	Mesure d'Accompagnement
MAEP	Ministère de l'Agriculture de l'Elevage et de la Pêche
MEDD	Ministère de l'Environnement et du Développement Durable
MIS	Management Information System
ML	Mères- Leaders
MPE	Moyen et Petite Entreprise
MPP	Mémoire de Préparation de Projet
MPPSPF	Ministère de la Population, de la Protection Sociale et de la Promotion de la Femme
MSM	Marie Stopes Madagascar
ORN	Office Régional de Nutrition
PAG	Plan d'Aménagement et de Gestion
PAM	Programme Alimentaire Mondial
PAOMA	Paositra Malagasy
PFE	Pratiques Familiales Essentielles

PSRC	Protection Social Réactive aux Chocs
PTBS	Programme de Travail et de Budget Semestriel
RC	Relais Communautaire
SEC	Suivi Evaluation Communautaire
SES	Sauvegarde Environnementale et Sociale
SO	Socio-Organisateur
SOMACC	Socio-Organisateur chargé des activités de Mesures d'Accompagnement
TMDH	Transfert Monétaire pour le Développement Humain
TMNC	Transfert Monétaire Non Conditionnel
USD	United State Dollar
VBG	Violence Basée sur le Genre
VIH/MST	Virus de l'Immunodéficience Humaine/ Maladie Sexuellement Transmissible
VIH/SIDA	Virus de l'Immunodéficience Humaine/ Syndrome d'ImmunoDéficience Acquise

INTRODUCTION

Le Projet de Filets Sociaux de Sécurité (FSS) fait partie du programme du Gouvernement Malagasy qui vise à « **aider le Gouvernement à accroître l'accès des ménages extrêmement pauvres aux services de protection sociale et à jeter les bases d'un système de protection sociale** ». Il s'intègre dans la Stratégie Nationale de la Protection Sociale (PNPS) promulguée en 2015.

Financé par l'IDA d'un montant équivalent à hauteur de 40 millions USD sous forme d'un crédit (Crédit IDA 5708 MG), la première phase du projet a été démarrée en 2015.

En 2016, un financement additionnel d'un montant équivalent à hauteur de 35 millions USD a été alloué par l'IDA sous forme de don (IDA-D1450) au Gouvernement Malagasy dans l'objectif de renforcer le projet FSS. Ce financement additionnel s'insère dans le cadre de la « Réponse pour le relèvement précoce contre la sécheresse » qui est destiné au profit des populations sinistrées dans deux régions dont la région Anosy et Androy.

Compte tenu des résultats obtenus lors de la mise en œuvre des deux premiers financements du programme FSS¹ et selon les besoins exprimés, un don supplémentaire d'un montant équivalent à 90 millions USD a été octroyé par l'IDA (IDA-D4340) au Gouvernement Malagasy en 2019. L'objectif étant de permettre au projet FSS: (i) de renforcer les interventions dans les anciens districts² bénéficiaires et, (ii) d'élargir les interventions dans trois (03) nouveaux districts dont Arivonimamo, Manandriana et Toliara II. Le choix de ces nouvelles zones d'interventions a été adopté sur la base de discussion entre les partenaires clés lors de la préparation du projet FSS FA2 et tient compte en particulier de la situation en matière de sécurité. Le ciblage des ménages bénéficiaires était basé sur les mêmes critères que dans les projets parents.

Le présent rapport rend compte les avancements des activités dans le cadre du financement supplémentaire du programme FSS (financement additionnel n°2) – période janvier à juin 2020.

Le document est structuré comme suit :

- A. Présentation du projet FSS- Financement additionnel n° 2 (FSS FA 2)
- B. Situations techniques et financières du semestre terminant le 30 juin 2020
- C. Situation de la passation de marchés au 30 juin 2020
- D. Situation des indicateurs au 30 juin 2020
- E. Perspectives pour le prochain semestre allant de juillet à décembre 2020.

¹ Les activités relatives aux deux premiers financements ont été déjà achevées tandis que leurs clôtures officielles ont été reportées au mars 2022.

² Anciens districts d'intervention:

FSP : Antanifotsy , Isandra, Vatomandry, Manakara et Ankazoabo

TMDH : Ambohimahaso, BetsiokyAtsimo, Faratsiho, Betafo, Mahanoro, Toamasina II, Vohipeno, Amboasary-Sud, Ambovombe, Beloha, Bekily et Tsihombe

A. PRESENTATION DU PROJET FSS – FA 2

Le financement additionnel 2 du programme FSS est conçu en gardant le même objectif du programme Filets Sociaux de Sécurité qui est de « **aider le gouvernement à accroître l'accès des ménages extrêmement pauvres aux services de protection sociale et à jeter les bases d'un système de protection sociale** ».

Le financement additionnel n°2 du projet FSS est mis en œuvre par le Fonds d'Intervention pour le Développement (FID) sous l'égide du Ministère de la Population, de la Protection Sociale et de la Promotion de la Femme (MPPSPF) et avec l'appui et la collaboration des ministères sectoriels, entre autres, le Ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche (MAEP), le Ministère de l'Environnement et du Développement Durable (MEDD), le ministère de l'éducation, etc. Cette collaboration multisectorielle est régie par une convention de partenariat signée par chacune des parties.

Le projet est constitué de trois composantes dont les deux premières sont à la charge du FID si la troisième est à la charge du MPPSPF.

- **Composante 1:** Mettre en place un filet de sécurité pour les pauvres dans certaines zones rurales (*69,7 millions USD et géré par le FID*).
 - 1.1 : Mettre en place un programme de filet de sécurité productif (*17,8 millions USD*)
 - 1.2 : Élargir le projet pilote de transferts monétaires pour le développement humain (*36,5 millions USD*)
 - 1.3 : Intervention rapide en cas de catastrophe naturelle (*20 millions USD*)
- **Composante 2:** Renforcer l'administration, le suivi et la redevabilité sociale du filet de sécurité (*12.2 millions USD et géré par le FID*)
- **Composante 3:** Renforcer les capacités institutionnelles en matière de coordination, de suivi et d'évaluation du système de protection sociale (*3.5 millions USD et géré par le MPPSPF*).

La carte d'intervention est représentée ci-après.

DISTRICTS D'INTERVENTION FSS FA 2



A.1. Le programme Filet de Sécurité Productif (FSP)

Les activités développées dans le cadre de la sous-composante Filet de sécurité productif (FSP) consistent à « *bâtir des actifs productifs sur la base de travaux d'aménagement effectués sous forme d'argent contre travail réalisés selon la méthode à haute intensité de main d'œuvre (HIMO)* ». Les bénéficiaires des activités de filets sociaux productifs sont les ménages extrêmement pauvres dans les zones sélectionnées. Une grande majorité de ces bénéficiaires (environ 80%) sont des ménages aptes au travail (donc disposant d'au moins un membre du ménage capable de travailler) tandis qu'une partie de ces bénéficiaires (jusqu'à 20%) sont des ménages inaptes au travail (dont aucun membre du ménage n'est capable de travailler).

Les bénéficiaires reçoivent un transfert monétaire³ en contrepartie des travaux effectués tandis que les individus invalides répondant à des critères de sélection reçoivent un transfert monétaire non conditionnel au moment du paiement.

Les activités du programme sur un site sont constituées des quatre (04) interventions pour un total de 160 jours étalés pendant deux ans et demi. Les ménages participeront aux travaux publics pendant deux périodes bien définies par année: (i) pendant la période de soudure qui se situe généralement avant la récolte et (ii) pendant la période de préparation de la rentrée scolaire.

Le programme FSP intervient dans 07 Districts issus des 07 régions⁴.

A part les transferts monétaires, les bénéficiaires de cette sous composante reçoivent également des mesures d'accompagnement notamment :

- **Le renforcement des capacités techniques** en rapport avec les projets de démonstration « argent contre travail », en vue d'améliorer la productivité des ménages dans la gestion de l'agriculture et de l'élevage, et les activités de Conservation des sols et de l'eau (CSE). La formation technique dispensée (agriculture et élevage familiaux) correspond bien aux besoins quotidiens des bénéficiaires et enrichit leurs connaissances avec des techniques novatrices ;
- **L'éducation environnementale** pour amener les ménages à adopter des pratiques environnementales positives, telles que la gestion des déchets, pour une réduction au minimum des pertes en eau ; la lutte contre la déforestation et les feux de brousse ; et la réduction de la pollution de l'eau ;
- **L'inclusion financière et les plans d'affaires** visant à promouvoir l'épargne familiale et communautaire et à améliorer la capacité des ménages à développer leurs activités génératrices de revenus (AGR), principalement celles liées aux techniques acquises sur les sites de démonstration « argent contre travail ». Ceci inclut d'appuyer la création de groupes d'épargne villageois et d'aider à l'élaboration de plans d'affaires simples.
- **Des sensibilisations** sur le Planning familial, Wash, lutte contre le VIH/MST, Santé Publique et la promotion des Pratiques Familiales Essentielles
- **Le Développement de la Petite Enfance Intensifié** à travers l'Education Parentale sur la stimulation et éveil des enfants âgés de 0 à 5 ans.

³ Les bénéficiaires reçoivent 4 500 Ar par jour en contre partie des travaux effectués.

⁴ District Arivonimamo pour la région Itasy ; Antanifotsy pour la région Vakinankaratra; Manandriana pour la région Amoron'i Mania ; Isandra pour la région Haute Matsiatra ; Vatomandry pour la région Atsinanana ; Manakara pour la région Vatovavy Fitovinany et Ankazoabo pour la région AtsimoAndrefana.

A.2. Le programme Transfert Monétaire pour le Développement Humain (TMDH)

Le Transfert Monétaire pour le Développement Humain (TMDH) est un système de transfert d'argent conditionnel dont la finalité est de fournir un appui monétaire aux ménages pauvres et vulnérables afin de les inciter à scolariser leurs enfants âgés de 6 à 12 ans (en cycle primaire). Ce système a pour objectif final la réduction de la déscolarisation et la déperdition scolaire induite par la pauvreté des ménages cibles.

Le montant du transfert est composé d'un montant de base et des incitations pour encourager la scolarité et la présence continue des enfants de niveau primaire à l'école. Les ménages perçoivent leur transfert tous les 2 mois à raison de 6 transferts par an pour une durée de 2,5 ans, soit au total 15 transferts pendant le 2^{ème} financement additionnel du programme FSS.

Le programme TMDH intervient dans 13 districts issus des 07 régions⁵.

En plus des transferts monétaires, les bénéficiaires du TMDH reçoivent aussi des mesures d'accompagnement développées dans les Espaces de Bien-Etre (EBE) notamment :

- Le développement du bien-être familial ;
- Le développement de la petite enfance ;
- L'inclusion économique ;
- L'inclusion productive.

⁵ TMDH : Districts Ambohimahaso pour la Région Haute Matsiatra ; BetiokyAtsimo et Toliara II pour la région AtsimoAndrefana ; Faratsiho et Betafo pour la région Vakinankaratra ; Mahanoro et Toamasina II pour la région Atsinana ; Vohipeno pour la région Vatovavy Fitovinany ; Amboasary-Sud pour la région Anosy ; Ambovombe, Beloha, Bekily et Tsihombe pour la région Andoy.

A.3. Le programme pour un relèvement précoce après les catastrophes naturelles

L'intervention de redressement rapide en cas de catastrophe naturelle, assortie d'un financement pour faire face aux crises éventuelles par des actions « argent contre travail », par l'élargissement vertical ou horizontal des transferts monétaires dans les zones dotées de programmes de transfert monétaire existants et/ou de la réhabilitation d'infrastructures dans des districts existants ou nouveaux ; les fonds non utilisés dans le cadre de cette composante seront réaffectés s'ils restent inutilisés dans un délai de 12 mois avant la clôture du FS2.

L'intervention en transferts monétaires non conditionnels (TMNC), en réponse du COVID-19 entre dans cette sous composante.

En effet, depuis la déclaration officielle de la pandémie de coronavirus (COVID-19) le 20 mars 2020 à Madagascar, le Gouvernement Malagasy a décrété la situation sanitaire d'urgence (décret n° 2020-359) comme riposte à la propagation du virus et a édicté un certain nombre de mesures dont les impacts se traduisent en termes de suspension voire de perte de revenus aussi bien pour la population du secteur formel qu'informel.

Pour atténuer l'impact de cette crise sanitaire, le gouvernement avec l'appui de divers partenaires techniques et financiers a mis en place un ensemble cohérent de réponses dont le « Tosika Fameno » qui est un transfert monétaire non conditionnel d'un montant de 100 000 Ariary par ménage par tranche, le Vatsy Tsinjo qui est constitué de panier, kit de produits de première nécessité, le Tsena Mora qui est la vente de produits de première nécessité à prix réduits, prix sociaux au niveau des Fokontany.

Cet ensemble de réponse est destiné à l'endroit des familles en situation d'extrême pauvreté et de vulnérabilité comme les personnes âgées (Tosika Fameno, Vatsy Tsinjo) mais globalement aussi à l'ensemble de la population touchée par les conséquences des mesures barrières imposées.

C'est dans le cadre de la mise en œuvre des transferts monétaires non conditionnels en réponse au COVID-19 « Tosika Fameno » que le projet FSS intervient (à travers le FID) dans les communes urbaines d'Antananarivo, de Toamasina Urbain et Commune Toamasina Suburbain, de Fianarantsoa I et 9 Communes du district de Lalangina.

Compte tenu de l'insuffisance de fonds disponible sur la catégorie relative à la sous composante TMNC dans la répartition de fonds du Programme FSS, une restructuration de fonds alloués entre les sous composantes réponses aux crises a été opérée avec l'accord de la Banque Mondiale en date du 22 Avril 2020

B. SITUATIONS TECHNIQUES ET FINANCIERES DES ACTIVITES POUR LE SEMESTRE TERMINANT LE 30 JUIN 2020

I. Réalisations techniques – période janvier à juin 2020

La période a été marquée par le démarrage effectif des activités relatives au financement additionnel 2 du projet Filets Sociaux de Sécurité (FSS FA 2). Cependant, certaines activités ont connu des glissements à cause de la pandémie COVID-19 et aux diverses mesures imposées par l'état d'urgence sanitaire y afférentes depuis le 20 mars 2020.

Ci-après les réalisations au 30 juin 2020.

a. Programme Filet de Sécurité Productif (FSP):

Les activités prévues pour les anciens districts au cours de la période ont été presque entièrement réalisées. Il s'agit en générale des démarrages, des supervisions et des réceptions des travaux (8^e intervention) dans tous les sites avec le paiement des salaires des ménages bénéficiaires. Notons toutefois que certaines activités telles l'atelier d'échange CPS, la formation des formateurs en alphabétisation, les activités relatives au DPEI, etc. ont dû reporter pour cause de la pandémie COVID-19.

En ce qui concerne les nouveaux districts d'intervention, les activités liées à la planification et au ciblage et enregistrement des ménages bénéficiaires sont en bonne voie. Cependant le démarrage effectif des travaux ne sont pas réalisés.

Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau qui suit :

Prévisions du 1 ^{er} semestre 2020	% Réalisation au 30 juin 2020	Observations
ANCIENS DISTRICTS		
Encadrement travaux 8^e intervention	90 %	239 chantiers achevés. Réception et paiement de la dernière tranche des salaires des bénéficiaires en cours au 30 juin 2020
Planification: Démarrage effectif et réalisation en continue des diagnostics participatifs et des activités de planification des trois interventions restantes	50 %	Diagnostics participatifs en cours pour les Districts Vatomandry, Antanifotsy
	25 %	Démarrage des diagnostics participatifs Isandra, Ankazoabo, Manakara
Formation des AGECE	100 %	Réalisée avant démarrage du 8 ^e intervention
Atelier d'échange CPS	-	En attente de la nomination des CPS des nouveaux districts
Formation alphabétisation (AS, RC)	-	Reportée au mois de juillet 2020
Recyclage DPEI	-	Formation avec DEPA reporté au mois de juillet 2020 à cause du confinement
Encadrement travaux 8^e intervention	90 %	239 chantiers achevés. Réception et paiement de la dernière tranche des salaires des bénéficiaires en cours.
NOUVEAUX DISTRICTS		
Planification: identification et délimitation des terroirs effectuée.	60 %	Terroirs délimités. Identification et la validation des Zones d'Intervention Potentielles par les

Démarrage de la planification participative des travaux		membres de la CTISD en cours. (12 terroirs validés sur les 20 délimités)
Ciblage: présélection et validation communautaire des ménages ciblés dans les terroirs priorités.	25 %	Démarrage des activités des ciblage notamment la présélection et la validation communautaire des ménages ciblés dans trois terroirs priorités.
Formation des AGECE	-	Activités reportées au mois d'Aout 2020
Atelier d'échange CPS	-	
Formation alphabétisation (AS, RC)	-	
Recyclage DPEI	-	
Tsatok'angady par district	-	
Encadrement des travaux	-	

b. Programme de Transfert Monétaire pour le Développement Humain (TMDH) :

Dans le cadre du programme TMDH, la préparation, la réalisation des paiements des transferts monétaires, la mise en œuvre des mesures d'accompagnement mais également le démarrage des activités au niveau du nouveau district (Toliara II) ont marqué ce 1^{er} semestre allant du 01 janvier au 30 juin 2020. Ainsi, on distingue parmi les grandes lignes des réalisations :

b-1) Ciblage communautaire, Suivi de coresponsabilités et Transferts de fonds, recertification à Betafo :

Prévisions du 1 ^{er} semestre 2020	Réalisation au 30 juin 2020	%	Commentaires
Anciens districts			
Réalisation des Transferts TMDH	Paiement des transferts cumulés période octobre 2019 – décembre 2019 réalisés au niveau de tous les districts	100%	La coresponsabilité n'a pas été appliquée pour les transferts, jusqu'au retour à la normale de la situation scolaire. La collecte s'est arrêtée aux registres du mois de février, 34 670 enfants sur 42 324 (nombre d'enfants en âge scolaire) fréquentent l'école au moins 80% du temps de classes, soit un taux de 82%.
	Paiement des transferts période février – avril 2020 : réalisés au niveau de tous les districts TMDH et FIAVOTA, à l'exception de 10 Fokontany des districts de Mahanoro et Toamasina II.	95%	Mahanoro et Toamasina II : suspension du paiement des transferts période février et avril 2020 de 10 Fokontany suite à la persistance de la pandémie COVID 19 à Toamasina. Ainsi, au total, 106 320 ménages bénéficiaires ont reçu leur transfert.
	Paiement du transfert de la période juin 2020 : réalisés au niveau des districts de Vohipeno, Faratsiho et en cours au niveau des autres districts	43%	Tous les paiements seront finalisés au mois de juillet 2020
Recertification à Betafo	Collecte des données effectuée	100%	
	Rapport de collecte de données validée par FID	100%	
	Réception du rapport descriptif du cabinet MANISA + BDD (Draft 1)	80%	Les premiers retours du FID sont en cours de traitement au niveau du cabinet Manisa
	Réception du rapport de modélisation du Consultant statisticien (Draft 1)		Discussion organisée avec la Banque Mondiale en juillet 2020 sur les résultats de la modélisation ==> Les retours/commentaires seront traités par le consultant

Prévisions du 1 ^{er} semestre 2020	Réalisation au 30 juin 2020	%	Commentaires
Nouveau district : Toliara II			

Ciblage des ménages bénéficiaires	Ciblage des ménages bénéficiaires de la vague 1 (03 communes) et vague 02 (04 communes).effectué	100%	
Réalisation du Transfert TMDH	- La contractualisation de l'agence de paiement PAOMA	100%	
	- La réalisation du premier transfert de la vague 01 (03 communes) du district de Toliara II à l'exception des 02 Fokontany qui sont très enclavés	80%	Vague 01 : 2 940 ménages bénéficiaires ont bénéficié du 1er transfert.
	- La préparation du premier transfert de la vague 02 (04 communes) du district de Toliara II : signature des contrats des ménages bénéficiaires, préparation des états de paiement.	En cours	Le paiement du premier transfert de la vague 02 est prévu être finalisé au mi-juillet 2020

b-2) Mesures d'accompagnement :

Prévisions du 1 ^{er} semestre 2020	Réalisation au 30 juin 2020	%	Commentaires
Anciens districts			
Mise à jour des informations sur les Mères Leaders	La mise à jour de 4 640 Mères Leaders au niveau des districts de Betafo, Faratsiho, Toamasina II, Mahanoro, Ambohimahaso, Vohipeno, Betioky Atsimo, Amboasary, Bekily, Ambovombe, Tsihombe et Beloha a été effectuée. Il y a eu la mise en place des nouvelles Mères Leaders suite aux enclavements de certains hameaux.	100%	
Mise en place des relais communautaires	165 relais communautaires ont été mis en place.		
Inclusion productive : Formation des formateurs du FID (SO et AS)	La réalisation de 05 formations pour les formateurs (Accompagnateurs Spécialisés) en inclusion productive avec la DRAEP. Les thématiques traitées étant : basket compost, cultures hors sols, cultures maraichères, ...Il est à préciser que l'inclusion productive concerne les districts de Betafo, Faratsiho, Toamasina II, Mahanoro, Ambohimahaso, Vohipeno, Betioky Atsimo et les districts de Fiavota. Ensuite, ces accompagnateurs spécialisés ont formé les bénéficiaires au niveau des sites TMDH puis, ils ont fait le suivi de ces activités	80%	Mahanoro et Toamasina II : activité suspendue suite à la persistance de la pandémie COVID 19 à Toamasina.

Prévisions du 1 ^{er} semestre 2020	Réalisation au 30 juin 2020	%	Commentaires
	d'inclusion productive de ces bénéficiaires.		
<p>Inclusion financière : Recrutement des Socio-organismes pour le coup de pouce (SOCOP)</p>	104 Socio-organismes pour le coup de pouce (SOCOP) ont été recrutés et sous contrat du FID. Parmi les SOCOP figurent les anciens SOCOP de l'ONG Voahary Salama et les autres sont des nouveaux SOCOP.	100%	Mahanoro et Toamasina II : session de coup de pouce annulée à cause de la suspension du paiement des transferts février et avril 2020 de 10 Fokontany suite à la persistance de la pandémie COVID 19 à Toamasina.
<p>Inclusion financière : Formation des SOCOP au niveau des districts du TMDH (Formation sur le protocole du coup de pouce, la délivrance des coups de pouce)</p>	05 formations des SOCOP (sur le protocole du coup de pouce, la délivrance des coups de pouce) ont été réalisées au niveau des districts du TMDH au niveau des directions interrégionales (DIRA, DIRT, DIRF, DIRU, DIRK)	100%	
<p>Inclusion financière : Supervision des SOCOP par le FID lors des transferts</p>	La supervision des SOCOP par le FID lors des transferts n°21 et n°22 (correspondant au transfert mois de février et avril 2020 : transferts cumulés) est effectuée pour la DIRT, DIRK, DIRF et DIRU.	80%	L'activité a été suspendue au niveau de la DIRA face à la situation de la pandémie COVID 19. La prestation des SOCOP du mois de juin 2020 sera reportée pour le mois d'août 2020
<p>Développement et bien être de la famille : Formation des formateurs (CP et AS) sur la diversification alimentaire avec ORN</p>	03 formations des formateurs (CP et AS) sur la diversification alimentaire avec ORN ont été réalisées au niveau de 03 directions interrégionale (DIRK- DIRF et DIRA).	60%	L'ORN n'était pas disponible au niveau de la DIRT et DIRU. Néanmoins, la formation sur la diversification alimentaire au niveau de ces directions a été effectuée par le SOMACC sur la base des slides de

Prévisions du 1 ^{er} semestre 2020	Réalisation au 30 juin 2020	%	Commentaires
			formation de l'ORN en 2019. L'appui de l'ORN pour DIRU et DIRT sera réalisé après le mois de juin 2020
Développement et bien être de la famille : Formation des ML et CPS par les AS sur la diversification alimentaire au niveau des sites TMDH	05 formations des ML et CPS par les AS sur la diversification alimentaire au niveau des sites TMDH ont été effectuées	100%	
Développement et bien être de la famille sur le thème de la nutrition : Mise en œuvre des Espaces de Bien être	10 EBE sur la diversification alimentaire au niveau des sites TMDH sont effectués.	100%	
Développement et bien être de la famille : Formation des formateurs (CP et AS) sur le planning familial par MSM	03 formations des formateurs (CP et AS) sur le planning familial par MSM ont été réalisées au niveau de 03 Directions (DRK, DRF, DRT).	60%	Les 02 formations pour la DIRA et DIRU seront effectuées après le mois de juin 2020
Développement et bien être de la famille : Alphabétisation Identification des sites alphabétisation au niveau de chaque district du TMDH	Sites d'alphabétisation identifiés pour chaque direction interrégionale.	100%	Il s'agit des sites pilotes par district (3 ou 4 fokontany au niveau de chaque district du TMDH.
Développement et bien être de la famille : DPEI au niveau des anciens sites pilotes	Continuation des activités DPEI au niveau des anciens sites pilotes (district de Betafo, Vohipeno, Betioky Atsimo) depuis avril 2020 Education parentale sur les thèmes du développement de la petite enfance au niveau des EBE	50%	Les thématiques non effectuées seront réalisées courant le 2 nd semestre 2020

Prévisions du 1 ^{er} semestre 2020	Réalisation au 30 juin 2020	%	Commentaires
Nouveau district : Toliara II			

Prévisions du 1^{er} semestre 2020	Réalisation au 30 juin 2020	%	Commentaires
Mise en place des Mères Leaders	240 Mères Leaders ont été mises en place.	100%	Ces Mères Leaders ont été mises en place dans les fokontany du district de Toliara II où il y a les MACC
	Formation des Mères Leaders sur le processus du TMDH ainsi que leur rôle respectif.	100%	
Baseline sur le DPEI	Identification des fokontany objet d'évaluation d'impact DPEI : assignation des fokontany effectuée au mois de mai 2020 par la Banque Mondiale	100%	66 fokontany dans 6 communes du district de Tuléar II
	Guide pour le FID en cours d'élaboration par Ideas42, pour le pré-test du design de coup de pouce DPEI.		Guide de facilitation encore en cours d'élaboration

c) Réponses aux catastrophes naturelles :

Argent contre travail (ACT) – post catastrophe.

Activités	Prévisions du 1 ^{er} semestre 2020	Réalisation au 30 juin 2020	%	Observations
ARGENT CONTRE TRAVAIL (ACT). Réponse à la zone de convergence intertropical qui a touché le pays durant la période	57 chantiers créant 171 000 Hommes Jours pour 8 550 ménages	43 chantiers créant 129 000 Hommes Jours pour 6 450 ménages	100%	
		10 chantiers créant 18 000 Hommes Jours pour 1 500 ménages	60%	A cause du COVID : Les travaux dans 10 chantiers dans le District Ambilobe ont été arrêtés (avancement de 60 %). Les 04 chantiers prévus à Antalaha ont été annulés.

Transfert monétaire non conditionnel (TMNC) et appui nutritionnel.

Activités	Prévisions du 1 ^{er} semestre 2020	Réalisation au 30 juin 2020	Observations
TMNC dans le cadre du Programme de protection Sociale Réactive aux Chocs (PSRC)	Réalisation des deux transferts (n°3 et n°4) pour les 28 627 ménages la première vague (8 communes: <i>Ambovombe, Beloha, Kopoky, Tsihombé, Anivorano Mitsinjo, Bevitiky, Tsikolaky, Maroviro</i>)	75%	Transfert n°3 réalisé, transferts n°4 en cours d'achèvement
	Réalisation des quatre transferts TMNC pour les 22 642 ménages extension de la deuxième vague (9 Communes: <i>Maroalopoty, Maroalomainty, Andranobory, Sampona, Ankaranabo Nord, Tameantsoa, Androka et Ankiliabo</i>)	75%	3 transferts réalisés, transferts n°4 en cours d'achèvement
	Paiement du fonds de soutien pour les ménages bénéficiaires de l'extension horizontale	-	Validation des Fiches de Projet en cours. 1ère Tranche à partir du mois d'Aout
	Paiement de fonds de redressement pour les bénéficiaires FIAVOTA	-	

Transfert monétaire non conditionnel (TMNC) réponse au COVID 19

Le Transfert Monétaire Non Conditionnel (TMNC) dans le cadre d'urgence social COVID-19 est un système de transfert d'argent au niveau des ménages ciblés dont la finalité est d'atténuer/amortir les effets néfastes du

confinement pour les ménages vulnérables ainsi que pour les catégories de ménages dont les revenus sont coupés à cause du confinement.

En effet, ces ménages appartiennent généralement à des catégories socio-professionnelles dont les revenus sont perçus au jour le jour tels que les chauffeurs de transports publics et leurs auxiliaires (receveurs), les chauffeurs de taxi, de tricycles ou cyclo pousses, les petits marchands informels (crieurs de journaux, tireurs de charrette, vendeurs à la sauvette ou ceux qui vivent journalièrement d'expédients, les travailleurs du sexe, les lavandières etc...) ainsi que les personnes âgées de plus de 70 ans sans revenu.

Les catégories socio-professionnelles qui bénéficieront de ces transferts seront arrêtées par la Commune Urbaine sur instruction formelle du Gouvernement, et l'unité de sélection des bénéficiaires aux transferts non conditionnels est le ménage⁶.

Le montant des transferts s'élève à 200 000 Ariary par ménage et payable en deux tranches (100 000 Ariary par ménage par tranche).

Le paiement des transferts se fera par des Agences de paiement recrutées par le FID, dont entre autres :

- Les Opérateurs de mobile money (Orange et Telma) et/ou ;
- La Paositra Malagasy à travers la Paositra Money.

Les lieux de paiement ou caisses seront :

- Des cash points ou sous-distributeurs des opérateurs de mobile money (Orange et Telma) ;
- Les bureaux de la Paositra Malagasy, ou tout autre endroit éligible remplissant les critères y afférents.

Le calendrier de paiement sera déterminé de concert avec les Autorités des Communes Urbaines, les Agences de paiement, le FID et sera communiqué par des moyens appropriés (SMS, affichage ou annonce au niveau du fokontany...) aux bénéficiaires. Le paiement sera organisé de manière à éviter les attroupements des foules, les encombrements et les ruptures de disponibilité de fonds aux niveaux des caisses.

Les paiements seront sécurisés par des agents des forces de l'ordre ou des agents de sécurité.

L'ensemble des intervenants et acteurs sur terrain seront dotés en Équipements de Protections Individuelles contre la propagation du Covid-19. Ils devront respecter strictement les mesures telles que la distanciation, le port de cache bouche pour les caissiers, la disponibilité de stérilisation des mains par alcool ou gel hydro alcoolique durant le billettage.

Les réalisations dans le cadre du Transfert Monétaire Non Conditionnel (TMNC) en réponse COVID-19 sont présentés dans le tableau qui suit :

Sous composante	Prévisions Techniques au 30 juin 2020	Réalisation Techniques au 30 juin 2020	%	Observations
Transfert Monétaire Non Conditionnel « TOSIKA FAMENO »	Deux transferts de 100 000 Ariary pour 176 251 ménages bénéficiaires	Un transfert de 100 000 Ariary pour 166 370 ménages bénéficiaires	50 %	Le deuxième transfert a été reporté au mois de juillet 2020

Comme il s'agit d'une nouvelle activité, beaucoup de temps a été consacré à la préparation de la mise en œuvre. Ceci dit, le délai prévu pour la réalisation a été dépassé et on a dû reporter la réalisation du deuxième paiement à la fin du mois de juillet 2020 dans l'objectif d'améliorer la qualité de l'intervention en tenant compte des expériences tirées durant la réalisation du premier transfert et des recommandations des diverses instances en terme de Sauvegarde Sociale et Environnementale face à la pandémie COVID-19, dont :

⁶ Un ménage est l'ensemble des personnes habitant le même logement, partageant les mêmes repas et reconnaissant l'autorité d'une seule personne appelée chef de famille.

Sur la liste des bénéficiaires : des exercices d'assainissement de la liste des bénéficiaires basés sur des enquêtes et des recoupements à partir des fiches des plaintes reçues ont été réalisés afin de diminuer au minimum les inclusions. Ainsi, les inclusions feront l'objet de sortie du programme et la base de données des agences payeurs sera mise à jour. Des mises à jour des informations sur les bénéficiaires (correction des erreurs de frappe des noms et des numéros CIN) sont également réalisées dans la base de données des agences payeurs (PAOMA, TELMA et ORANGE).

Organisation et modalité de paiement :

- Décentralisation au maximum des lieux de paiement (au niveau des fokontany) avec une prévision d'un guichet par site de paiement et ceci dans des endroits aérés et spacieux.
- Chaque guichet effectue un paiement de 100 ménages bénéficiaires/jour.
- Les bénéficiaires seront payés par vague de 50 environ (1ère vague de 7h à 9h et 2ème vague de 10h à 12h).
- Distribution de ticket aux bénéficiaires stipulant la date et heure de paiement.
- Utilisation exclusive de gel hydro alcoolique au lieu de dispositif de lavage des mains (eau+savon)
- Les Comités de Protection Sociale (Komity) assureront le service d'ordre et le respect des gestes barrières (port de cache bouche et distanciation physique au moyen de marquage au sol) en collaboration avec les AGEX,
- En cas de règlement de certains problèmes liés aux paiements, l'Agex traitera par communication téléphonique les "Bon à Payer" en relation avec la Direction Générale du FID,
- Utilisation de numéro vert et enregistrement en ligne des plaintes.
- Renforcement des messages au moyen de la communication de masse (affiches, radio)

Réhabilitation et reconstruction des infrastructures.

Pour faire face aux dégâts engendrés par le passage de la zone de convergence intertropical qui a frappé plusieurs régions du pays durant la fin de l'année 2019 et le début de l'année 2020, 51 infrastructures font l'objet de saisine du BNGRC. Sur ce, évaluations techniques réalisées pour 19 infrastructures (Mémoire de Préparation des Projets établi), 32 infrastructures en cours de traitement interne par la direction en charge des activités post crise.

Activités	Prévisions du 1 ^{er} semestre 2020	Réalisation au 30 juin 2020	Observations
REHABILITATION et/ou RECONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES	Traitement, évaluation technique et élaboration des MPP pour 19 infrastructures	100%	
	Contractualisation des maîtrises d'œuvre et début des études pour les infrastructures déjà évaluées	-	Appel à manifestation d'intérêt (AMI) des BE réalisé. Contractualisation prévue au mois d'aout 2020

d) Gouvernance citoyenne

Prévisions pour la période	Réalisations au 30 juin 2020	% de réalisation	Commentaires
Le renforcement de la sensibilisation sur la gouvernance citoyenne et sur la lutte anticorruption	A chaque rencontre avec les communautés bénéficiaires (mission sur site) et lors de séance de prise en main des prestataires de service, des messages ont été passés pour qu'ils soient responsables en tant qu'acteurs et bénéficiaires du programme	NA	La prévision n'est pas quantifiable.
La formation - sensibilisation des membres de CPS sur la gouvernance citoyenne, sur la gestion des plaintes et sur la lutte anti corruption pour les nouvelles zones d'intervention (Arivonimamo et Manandriana pour FSP et Toliara II pour TMDH), le recyclage pour les anciennes zones	Au niveau des anciens districts : sensibilisation et renforcement de capacité des 20 CPS (20 sites), avec la participation de 71 membres, pour TMDH et 18 CPS (18 sites) avec 112 participants, pour FSP. Au niveau du FIAVOTA: sensibilisation et renforcement de capacité des 27 comités de gestion de plaintes (27 sites), avec la participation de 99 membres Pour les nouvelles zones, 6 CPS (6 sites) ont été touchés par la séance de formation- sensibilisation, avec la participation de 39 membres.	NA	Pour les nouvelles zones, les séances de formation ne sont pas encore réalisées pour Toliara II à cause de priorisation des activités TMNC. Pour le FSP, les CPS d'Arivonimamo sont en cours de mise en place actuellement; alors que pour Manandriana, les séances de formation ont été réalisées pour les 6 sites ayant des CPS mis en place.
La continuation de gestion des plaintes et cas des spéciaux (réception, traitement et réponse aux plaignants)	Réception et traitement de 7 plaintes ACT (post catastrophe) ; Réception 43 plaintes et traitement de 22 plaintes FSP ; Traitement des cas spéciaux FSP pouvant sortir 555 ménages du programme ; Réception de 490 plaintes et traitement de 387 plaintes TMDH; Traitement des cas spéciaux TMDH pouvant sortir 173 et intégrer 4 ménages au programme ; Réception de 1020 plaintes et traitement de 668 plaintes FIAVOTA; Traitement des cas spéciaux pouvant sortir 1348 et maintenir 79 ménages dans le programme.	NA	La prévision n'est pas quantifiable; mais en terme de traitement, 69% des plaintes ont été traitées
La mise en œuvre du suivi et évaluation communautaire (SEC)	La mise en œuvre de séance de suivi évaluation communautaire au niveau de 34 sites sur 71 pour FSP et de 30 sur 39 sites pour TMDH/FIAVOTA	58%	L'objectif de la période n'est pas atteint à cause de la perturbation engendrée par la pandémie (respect des gestes barrières)
Le renforcement du suivi de personnel de terrain (prestataires et personnel du FID) en vue de l'amélioration de la gouvernance	Mise en œuvre du mécanisme de gestion des plaintes et du mécanisme de suivi évaluation communautaire comme outils de suivi de qualité des prestations et des services fournis	NA	La prévision n'est pas quantifiable

e) Sauvegarde Environnementale et Social

Les thématiques de « Sauvegarde Environnementale et Sociale (SES) » traitées dans le présent rapport sont énumérées ci-après :

1. La sécurisation du programme
2. La sensibilisation au VIH/SIDA
3. La prise en compte de l'approche Genre
4. L'élaboration des Plans de Gestion et d'Exploitation des sites reboisés ou « PAG »
5. La prise de mesures Hygiène, Sécurité et Gestion des Déchets
6. L'élaboration des contrats fonciers

• *Sécurisation du programme au 30 juin 2020*


86% (19 sur 22) des actions stipulées dans le plan d'actions de sécurité, ont été entamées. Les activités non entamées sont (i) l'intégration du FID dans le système d'alerte de sécurité qui relève de la Gendarmerie, (ii) la création d'une plateforme de suivi & surveillance des incidents pour le LOBBYING en faveur de la justice et de la sécurité qui doit être initiée par le MPPSPF.

• *Sensibilisation au VIH/SIDA au 30 juin 2020*

En FSP, 67% des groupes de travail ont été sensibilisés au VIH/SIDA. Le reste bénéficiera de la sensibilisation lors de la prochaine intervention. Moindre, le taux de chantiers ayant été sensibilisés au VIH/SIDA en ACTPC, est estimé à 60%. En effet, la sensibilisation n'a pas pu être réalisée au niveau de certains sites car l'état d'urgence sanitaire a empêché les formateurs à y accéder.

• *Prise en compte de l'approche « Genre » au 30 juin 2020*

• *Pourcentage des femmes bénéficiaires du programme*

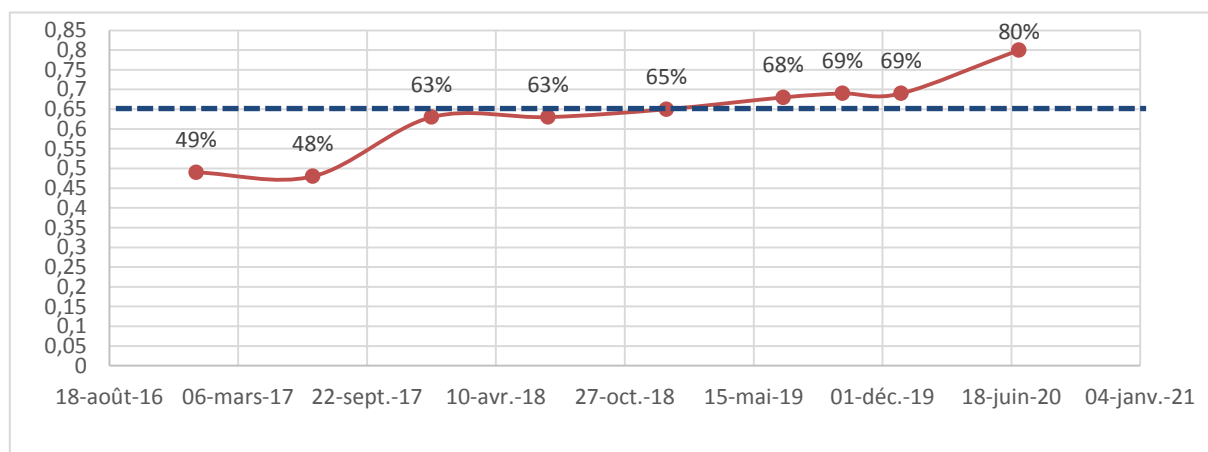


Estimé à **80%** le 03 juin 2020, le pourcentage des femmes bénéficiaires du programme FSS a largement dépassé l'objectif (65%).

• *Garderie au niveau des chantiers*

En FSP, 62% des chantiers ont été pourvus de garderie. La mise en place des garderies n'a pas eu lieu dans certains chantiers afin de réduire le risque de propagation du COVID. Tandis que l'installation des garderies a été effective dans le cadre de la mise en œuvre de l'ACTPC.

- **Elaboration des Plans de Gestion et d'Exploitation des sites reboisés ou « PAG » au 30 juin 2020 : Evolution du taux d'achèvement des PAG**

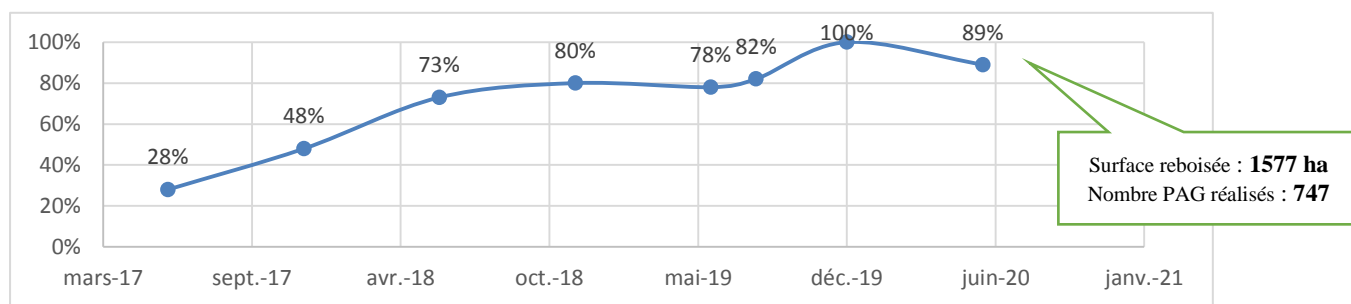

- **Prise de mesures Hygiène, Sécurité et Gestion des Déchets au 30 juin 2020**

- **Port EPI par les travailleurs**

Toutes sous-composantes confondues	Nombre de gilets distribués	Nombre de chaussures distribuées	Nombre de masques distribués	Nombre de casquettes (casques) distribuées	Nombre de gants distribués	Nombre de travailleurs aptes
FSP	26005	39406	18788	23952	935	25912
ACTPC	6730	6310	12600	6730	1010	6730

Le tableau montre que généralement, la dotation des EPI se poursuivait comme prévu, c'est-à-dire :

(i) FSP : 01 gilet, 01 paire de chaussures et 01 chapeau pour chaque titulaire et 01 paire de chaussures pour chaque remplaçant, sauf pour le cas de DRA où les chapeaux ont été remplacés par 02 masques par travailleur et 01 paire de gants pour certains, afin de renforcer les mesures sanitaires contre COVID. Dans la même optique, DRF a également doté des masques à tous les bénéficiaires. DRT en a distribué mais seulement à ceux qui n'en portent pas sur chantier.

(ii) ACTPC : au moins 01 gilet, 01 paire de chaussures et 01 chapeau pour chaque titulaire.

- **Mise à disposition d'une boîte à pharmacie**

La totalité des chantiers (FSP, ACTPC) sont pourvus d'une boîte à pharmacie conforme.

- **Hygiène et Gestion des déchets**

Mesures	FSP	ACTPC
Savon	100%	100%
Eau potable	100%	100%
Latrines	100%	25%
Fosses à ordures	100%	Facultatif

En ACTPC, les villes où les travaux se déroulaient, disposaient déjà des latrines.

- **Elaboration de contrats sociaux au 30 juin 2020**

Les taux de réalisation des contrats fonciers sont respectivement **86%** en FSP et **82%** en MACC TMDH. Toutefois, certains contrats fonciers établis font actuellement l'objet de régularisation comme la légalisation, la mise à jour de la liste des bénéficiaires et l'amélioration du croquis du terrain

f) Communication

Durant la période du 1er janvier au 30 juin 2020, le FID a été constant dans son effort pour une communication active, juste et adaptée à la situation. En accord avec la stratégie de la communication 2020, la participation de toutes les directions est confirmée par la réalisation de leur plan de communication respective, leur mise en œuvre ainsi que la remontée des informations. Toutefois nous constatons, d'après les rapports, que la nécessité de réaliser les ateliers de sensibilisation à la communication dans les directions restent d'actualité pour l'adoption des bons réflexes et l'optimisation des budgets à leur disposition.

Les plateformes numériques :

Site web : les mises à jour sont pleinement réalisées, le site reflète de plus en plus la transparence et la redevabilité, il a été enrichi de pages supplémentaires, les cartes interactives sont en place, la page de doléance est disponible en deux langues, la version mobile est optimisée. Une cinquantaine de publications a été comptabilisée (Articles, vidéos, manuels, annonces...). **54 432 visiteurs dont 77 % nouveaux visiteurs.**

Facebook : le plan de création et de diffusion a été réalisé à environ 50%, les interactions du public sur notre réseau social facebook sont en fortes augmentations, le contenu est enrichi. Un groupe privé à destination des collaborateurs a été ouvert. **122 publications / 146.976 vues / 26 640 interactions / 27 433 abonnés**

La relation presse :

Le tour d'une douzaine de rédaction a été réalisé pour une meilleure collaboration, globalement la presse a été de notre côté malgré les problèmes de fond liées au processus (Inclusion ancien Fiavota et Tosika Fameno).

1 encart presse d'une page (FSS) dans 3 quotidiens, 19 articles de presse TF, 22 reportages TV/Radio TF

Les supports et la diffusion :

Le fid'actus a été relancé en mars 2020. **1.359 destinataires** (e-mailing), disponible sur le web et fb (**27 433 abonnés**)

Les supports sont à jour (Bulletin, Dépliants, Affiches ...) et ont été bien réalisés et diffusés malgré un léger décalage sur le temps de la duplication. Plusieurs supports pour les programmes (FSP, TMDH, FIAVOTA) sont en attente de finalisation des contrats pour leurs duplications. Des supports spécifiques sur la lutte contre les VBG ou encore la Corruption ont été produites et diffusés (Affiches, flyers, spots audio).

La production à l'interne des vidéos pédagogiques à destination du public est effective pour Fiavota, Asa Avotra Mirindra et Tosika Fameno

2 - Renforcement de l'administration, du suivi et de la redevabilité sociale du filet de sécurité

1. Assistance technique.

- Elaboration des TDR et lancement du processus de la passation de marché pour le recrutement des consultants en charge de la mise à jour et amélioration du système d'information MIS, développement d'un nouveau système de paiement utilisant des moyens sécurisés d'identification des bénéficiaires (utilisation de carte électronique pour les ménages bénéficiaires avec terminal d'identification),
- La maintenance du logiciel TOM2PRO (mise en place TOM WEB)

2. Investissement.

- Le remplacement des matériels informatiques et mobiliers défectueux et l'acquisition de nouveaux matériels et mobiliers pour le personnel nouvellement recruté,
- Le remplacement des véhicules acquis en 2006 (17 véhicules dont 8 remplacés sur FSS FA 1 et le reste sur FSS FA2)
- L'achat de matériels de communication

3. Management du Projet.

- Réalisation des missions de supervisions et préparation des activités sur terrain
- Organisation des réunions de travail
- Notification et recrutement du personnel suivant nouvelle structure
- Etude et analyse de la mise en place des antennes au niveau des districts d'intervention
- Face aux contraintes liées à Covid 19, le cadre de travail du personnel est révisé prenant en compte les mesures barrières :
 - La désinfection hebdomadaire du bâtiment et des véhicules FID, désinfection journalière des objets les plus touchés par les mains, utilisation de pédiluve (à l'eau de javel) à l'entrée principale du bureau, utilisation de gels désinfectants pour tout le personnel du FID, port de cache bouche obligatoire et prise de température à l'entrée pour tout le personnel
 - L'adoption de la méthode de télétravail suivant l'organisation de chaque Direction. Les quotas de communication et de connexion du personnel ont été révisés à la hausse pendant la période d'urgence sanitaire.
- La préparation de l'assurance santé pour le personnel du FID.

3- Récapitulatif des réalisations techniques et financières se terminant le 30 juin 2020

a) Réalisations techniques et financières– 1er semestre 2020

Les réalisations technico-financières du 1er semestre 2020 pour les programmes (FSP, TMDH, réponses aux catastrophes naturelles) et la Gestion de projet sont présentées dans le tableau ci-après :

SOUS COMP OSANTES	SITUATIONS TECHNIQUES				SITUATIONS FINANCIERES en USD		
	Prévision 1er semestre 2020 (Cf PTBS janv. À juin 2020)	Réalisations du 1er semestre 2020	%	Observations	Budget 1er semestre 2020	Réalisations du 1er semestre 2020	%
FSP	280 chantiers de 40 jours par 36 000 ménages	239 chantiers de 40 jours réalisés par 33 450 ménages	85%	Les démarrages des chantiers prévus pour les deux nouveaux districts ont été reportés au mois d'aout 2020	3 681 176	2 512 141	68%
TMDH	Cinq (05) transferts monétaires pour 109 300 ménages	Quatre (04) transferts monétaires réalisés pour 106 320 ménages	80%		9 163 987	5 934 302	65%
Post crise	Prévision initiale dans PTBS: 222 chantiers ACT; Prévision révisée: 51 Chantiers ACT	47 Chantiers Achevés	92%	La révision de l'objectif dépend du besoin en fonction de la catastrophe survenu et des dégâts causés	571 897	363 758	64%
	Prévision initiale dans PTBS: Etudes pour 42 infrastructures Prévision révisée: Etudes pour 20 infrastructures	Traitement, évaluation technique et élaboration des MPP pour 20 infrastructures	48%		47 260	4 193	9%
	- deux (02) TMNC pour les 28 627 ménages de la première vague - quatre (04) TMNC pour les 22 642 ménages de la deuxième vague	- deux (02) TMNC réalisés pour les ménages de la première vague - trois (03) TMNC réalisés pour les ménages de la deuxième vague	75%	Le quatrième transfert est en cours d'achèvement	3 207 728	2 392 574	75%
	Appui nutritionnel				22 917	-	0%
	Deux (02) transferts 2 pour 176 251 ménages	1 transfert pour 166 370 ménages	50%		10 601 322	4 727 610	45%
Renforcement de la capacité institutionnelle de l'administration/ FID					3 548 403	2 625 079	74%
TOTAL FSS FA2					30 844 689	18 559 657	60%

b) Réalisations cumulées au 30 juin 2020 (par rapport aux objectifs FSS FA2)

SOUS COMP OSANTES	SITUATIONS TECHNIQUES			SITUATIONS FINANCIERES en USD		
	Objectifs	Réalisations cumulées au 30 juin 2020	Taux de réalisation	Allocations	Réalisations cumulées au 30 juin 2020 (USD)	Taux de réalisation
FSP	Quatre (04) interventions de 40 jrs. (soit 160 de travaux pour 36 000 ménages)	Une (01) intervention de 40 jours pour 33 450 ménages	25%	17 798 336	2 512 141	14%
TMDH	Quinze (15) transferts monétaires pour 106 900 ménages	Quatre (04) transferts monétaires réalisés pour 106 320 ménages	27%	36 489 786	5 934 302	16%
Post crise	700 chantiers ACT	47 chantiers ACT	7%	925 096	363 758	39%
	108 Infrastructures réhabilitées et/ou reconstruites	Traitement, évaluation technique et élaboration des MPP pour 20 infrastructures		2 235 000	4 193	0%
	Réalisation des 12 TMNC pour 51 269 ménages + FS	Réalisation des 4 TMNC	33%	3 535 805	2 392 574	68%
	Appui nutritionnel		-	943 965	-	-
	Deux (02) transferts 2 pour 176 251 ménages	Un (01) transfert pour 166 370 ménages	50%	10 601 322	4 727 610	45%
Renforcement de la capacité institutionnelle de l'administration/ FID				13 970 689	2 625 079	19%
TOTAL FSS FA2				86 500 000	18 559 657	21%

c) **Réalisations financières du 1er semestre de l'année 2020 (janvier à juin 2020)**

Les décaissements réalisés dans le cadre du projet FSS au cours de cette période (01 janvier – 30 juin 2020) se chiffrent à **18 559 657 USD** dont **15 934 578 USD** pour la composante Filet de sécurité social et **2 625 079 USD** pour l'administration du projet.

Les tableaux constituant le Rapport de Suivi des Activités ci-après concernent les réalisations cumulées au 30 juin 2020.

- **Tableau 1** : Sources et utilisation des fonds qui présente la situation cumulée des ressources et emplois pour la période allant du 01 janvier au 30 juin 2020
- **Tableau 2** : Utilisation de fonds par activité du projet qui montre le décaissement effectué par rapport à la prévision pour la période allant du 01 janvier au 30 juin 2020
- **Tableau 3** : Tableau d'avancement physique des activités.
- **Tableau 4** : Tableau de suivi de passation de marché pour la période allant du 01 janvier au 30 juin 2020

Tableau 1 : Sources et utilisation des fonds**SOURCES ET UTILISATIONS DES FONDS (MODÈLE I)**

Filets Sociaux de Sécurité - Financement Additionnel 2 Fonds d'Intervention pour le Développement SOURCES ET UTILISATIONS DES FONDS (MODÈLE I) Modèle : 1 Exercice 2020 Semestre finissant le 30/06/2020 DOLLAR (USD)					
Page 1/2					
Désignation	Semestre		Cumulatif		Prévisions 6 mois
RESSOURCES					
RESSOURCES		20 527 563,18		36 997 032,47	8 165 712,64
RESSOURCES IDA	20 527 563,18		36 997 032,47		
AUTRES RESSOURCES		48 821,44		48 821,44	
Intérêts débiteurs/créd et écart de change	48 821,44		48 821,44		
Total RESSOURCES		20 576 384,62		37 045 853,91	8 165 712,64
Financement Total		20 576 384,62		37 045 853,91	
EMPLOIS					
1a. Argent Contre Travail Productif (ACTP)	2 512 140,96		2 512 140,96		5 674 958,79
1a. Transfert Monétaire pour le Développement Humain (TMDH)	5 934 302,05		5 934 302,05		8 094 999,53
1d. Fonds redressement					3 354 872,49
1b. Réponses aux crises - ACT	363 758,06		363 758,06		207 515,14
1b. Réponses aux crises – Réhabilitaion des infrastructures	4 192,84		4 192,84		518 683,78
1c - Transfert Monétaire Non Conditionnel	2 135 618,93		2 135 618,93		513 534,20
1c - Fonds de soutien POST CATA	256 955,38		256 955,38		284 001,66
24 - Appui Nutritionnel					22 297,30
TMNC Réponses COVID 19	4 727 609,92		4 727 609,92		3 951 785,21
Total 2 Renforcement de capacité inst FID		2 625 079,31		2 625 079,31	
2. Renforcement de la capacité institutionnelle de l'adminis	2 614 325,25		2 614 325,25		4 017 793,82
2. Renforcement de la capacité institutionnelle COVID 19	10 754,06		10 754,06		11 467,21
Total EMPLOIS		18 559 657,44		18 559 657,44	26 651 909,11
Total des dépenses		18 559 657,44		18 559 657,44	26 651 909,11
Encaissements moins dépenses		2 016 727,18		18 486 196,47	-26 651 909,11
Evolution nette de l'encaisse		2 016 727,18		18 486 196,47	-26 651 909,11
Solde d'ouverture de l'encaisse					0,00
TRESORERIE					
COMPTE DESIGNE CENTRAL					
SOUS COMPTE DESIGNE DRT					
SOUS COMPTE DESIGNE DRD					
SOUS COMPTE DESIGNE DRF					
SOUS COMPTE DESIGNE DRA					
SOUS COMPTE DESIGNE DRU					
SOUS COMPTE DESIGNE DRK					
SOUS COMPTE DESIGNE DRP					
BANQUE CENTRALE	16 469 469,29				
Total TRESORERIE		16 469 469,29			
Total de l'encaisse d'ouverture		16 469 469,29			
Encaisse nette disponible		18 486 196,47		18 486 196,47	0,00
Solde de clôture de l'encaisse					
COMPTE DESIGNE CENTRAL	11 635 567,06		11 635 567,06		
SOUS COMPTE DESIGNE DRT	312 682,35		312 682,35		
SOUS COMPTE DESIGNE DRD					
SOUS COMPTE DESIGNE DRF	211 499,07		211 499,07		

SOUS COMPTE DESIGNE DRA	1 423 681,98		1 423 681,98		
SOUS COMPTE DESIGNE DRU	548 150,26		548 150,26		
SOUS COMPTE DESIGNE DRK	357 323,34		357 323,34		
SOUS COMPTE DESIGNE DRP	635 716,24		635 716,24		
BANQUE CENTRALE	3 361 576,16		3 361 576,16		
Solde total de clôture de l'encaisse		18 486 196,47		18 486 196,47	0,00

SOURCES ET UTILISATIONS DES FONDS (MODÈLE I)

Filets Sociaux de Sécurité - Financement Additionnel 2					
Fonds d'Intervention pour le Développement					
SOURCES ET UTILISATIONS DES FONDS (MODÈLE I)					
Modèle : 1					
Exercice 2020					
Semestre finissant le 30/06/2020					
ARIARY (MGA)					
					Page 1/2
Désignation	Semestre		Cumulatif		Prévisions 6 mois
RESSOURCES					
RESSOURCES		77 599 871 730,71		137 125 968 669,61	27 307 250 340,90
RESSOURCES IDA	77 599 871 730,71		137 125 968 669,61		
AUTRES RESSOURCES		2 601 381 281,04		2 601 381 281,04	
Intérêts débiteurs/créd et écart de change	2 601 381 281,04		2 601 381 281,04		
Total RESSOURCES		80 201 253 011,75		139 727 349 950,65	27 307 250 340,90
Financement Total		80 201 253 011,75		139 727 349 950,65	
EMPLOIS					
1a. Argent Contre Travail Productif (ACTP)	9 309 963 078,11		9 309 963 078,11		20 997 347 528,81
1a. Transfert Monétaire pour le Développement Humain (TMDH)	21 858 855 385,33		21 858 855 385,33		29 951 498 263,34
1d. Fonds redressement					12 413 028 200,00
1b. Réponses aux crises - ACT	1 311 507 999,98		1 311 507 999,98		767 806 000,00
1b. Réponses aux crises – Réhabilitation des infrastructures	15 220 000,00		15 220 000,00		1 919 130 000,00
1c - Transfert Monétaire Non Conditionnel	7 894 025 085,67		7 894 025 085,67		1 900 076 538,33
1c - Fonds de soutien POST CATA	979 000 000,00		979 000 000,00		1 050 806 126,00
24 - Appui Nutritionnel					82 500 000,00
TMNC Réponses COVID 19	17 773 368 208,12		17 773 368 208,12		14 226 426 745,16
Total 2 Renforcement de capacité inst FID		9 676 922 084,24		9 676 922 084,24	
2. Renforcement de la capacité institutionnelle de l'adminis	9 637 097 068,24		9 637 097 068,24		14 865 837 122,37
2. Renforcement de la capacité institutionnelle COVID 19	39 825 016,00		39 825 016,00		41 281 926,09
Total EMPLOIS		68 818 861 841,45		68 818 861 841,45	98 215 738 450,10
Total des dépenses		68 818 861 841,45		68 818 861 841,45	98 215 738 450,10
Encaissements moins dépenses		11 382 391 170,30		70 908 488 109,20	-98 215 738 450,10
Evolution nette de l'encaisse		11 382 391 170,30		70 908 488 109,20	-98 215 738 450,10
Solde d'ouverture de l'encaisse					0,00
TRESORERIE					
COMPTE DESIGNE CENTRAL					
SOUS COMPTE DESIGNE DRT					
SOUS COMPTE DESIGNE DRD					
SOUS COMPTE DESIGNE DRF					
SOUS COMPTE DESIGNE DRA					
SOUS COMPTE DESIGNE DRU					
SOUS COMPTE DESIGNE DRK					

SOUS COMPTE DESIGNE DRP					
BANQUE CENTRALE	59 526 096 938,90				
Total TRESORERIE		59 526 096 938,90			
Total de l'encaisse d'ouverture		59 526 096 938,90			
Encaisse nette disponible		70 908 488 109,20		70 908 488 109,20	0,00
Solde de clôture de l'encaisse					
COMPTE DESIGNE CENTRAL	44 859 532 531,78		44 859 532 531,78		
SOUS COMPTE DESIGNE DRT	1 197 111 214,82		1 197 111 214,82		
SOUS COMPTE DESIGNE DRD					
SOUS COMPTE DESIGNE DRF	722 661 076,36		722 661 076,36		
SOUS COMPTE DESIGNE DRA	5 376 792 304,56		5 376 792 304,56		
SOUS COMPTE DESIGNE DRU	2 082 205 808,72		2 082 205 808,72		
SOUS COMPTE DESIGNE DRK	1 328 803 570,07		1 328 803 570,07		
SOUS COMPTE DESIGNE DRP	2 381 228 107,15		2 381 228 107,15		
BANQUE CENTRALE	12 960 153 495,74		12 960 153 495,74		
Solde total de clôture de l'encaisse		70 908 488 109,20		70 908 488 109,20	0,00

Tableau 2 : Utilisation de fonds par activité du projet

UTILISATION DES FONDS PAR CATÉGORIE ET TYPE DE DÉPENSE (MODÈLE III)

Filets Sociaux de Sécurité - Financement Additionnel 2							
Fonds d'Intervention pour le Développement							
UTILISATION DES FONDS PAR CATÉGORIE ET TYPE DE DÉPENSE (MODÈLE III)							
Modèle : 2							
Exercice 2020							
Semestre finissant le 30/06/2020							
DOLLAR (USD)							
Composantes et Activités de l'Entité	Semestre			Cumulatif			Doc.D'éval. de l'Entité
	Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart	Durée de vie
Filets sociaux de sécurité(11+12+15)	27 244 969,14	15 934 578,13	11 310 391,01	27 244 969,14	15 934 578,13	11 310 391,01	
1.1 Argent Contre Travail Productif (ACT-P)	3 681 176,06	2 512 140,96	1 169 035,10	3 681 176,06	2 512 140,96	1 169 035,10	
Transfert en espèces aux bénéficiaires	1 723 437,31	1 321 146,74	402 290,57	1 723 437,31	1 321 146,74	402 290,57	
Frais de service des Agences de paiement	130 874,88	90 262,79	40 612,10	130 874,88	90 262,79	40 612,10	
Fournitures, travaux, services ACTP	1 826 863,87	1 100 731,44	726 132,43	1 826 863,87	1 100 731,44	726 132,43	
1.2 TMDH + FR(13+14)	9 163 986,69	5 934 302,05	3 229 684,64	9 163 986,69	5 934 302,05	3 229 684,64	
1.3 Transfert Monétaire pour le Développement Humain (TMDH)	9 163 986,69	5 934 302,05	3 229 684,64	9 163 986,69	5 934 302,05	3 229 684,64	
Transfert Monétaire Conditionnel	6 414 826,95	5 024 837,51	1 389 989,44	6 414 826,95	5 024 837,51	1 389 989,44	
Frais de service des agences de paiement	438 930,58	270 707,94	168 222,64	438 930,58	270 707,94	168 222,64	
Fournitures, travaux, services TMDH	2 310 229,16	638 756,60	1 671 472,57	2 310 229,16	638 756,60	1 671 472,57	
1.4 Fonds de redressement	0,00		0,00	0,00		0,00	
Transfert Fonds de redressement	0,00		0,00	0,00		0,00	
Frais de transfert FR	0,00		0,00	0,00		0,00	
Encadrement et accompagnement FR	0,00		0,00	0,00		0,00	
Réponses aux crises(16+17+18+21+22)	14 399 806,39	7 488 135,12	6 911 671,26	14 399 806,39	7 488 135,12	6 911 671,26	
1.6 ACT Post Catastrophes	571 897,23	363 758,06	208 139,18	571 897,23	363 758,06	208 139,18	
Rémunération des travailleurs	332 563,72	205 358,26	127 205,46	332 563,72	205 358,26	127 205,46	
Frais d'encadrement AGEX	53 713,63	29 132,32	24 581,32	53 713,63	29 132,32	24 581,32	
Matériels et matériaux	62 086,83	38 066,43	24 020,39	62 086,83	38 066,43	24 020,39	
Equipeement de Protection Individuelle (EPI)	104 511,91	77 923,45	26 588,45	104 511,91	77 923,45	26 588,45	
Coût EMS ACT POST CATA	17 907,60	12 449,55	5 458,05	17 907,60	12 449,55	5 458,05	

SES Post Cata ACT	1 113,54	828,04	285,50	1 113,54	828,04	285,50	
1.7 Réhabilitation/Reconstruction Post Cata	47 259,50	4 192,84	43 066,67	47 259,50	4 192,84	43 066,67	
Maîtrise d'Œuvre	40 800,00		40 800,00	40 800,00		40 800,00	
Travaux	4 192,84	4 192,84	0,00	4 192,84	4 192,84	0,00	
Coût EMS Infra Post cata	1 850,00		1 850,00	1 850,00		1 850,00	
SES Post cata INFRA	416,67		416,67	416,67		416,67	
1.8 TMNC + FS(19+20)	3 207 728,09	2 392 574,31	815 153,78	3 207 728,09	2 392 574,31	815 153,78	
1.9 TMNC	3 207 728,09	2 135 618,93	1 072 109,16	3 207 728,09	2 135 618,93	1 072 109,16	
Transfert en espèces au bénéficiaires - TMNC	2 915 593,74	1 940 118,12	975 475,62	2 915 593,74	1 940 118,12	975 475,62	
Prestation des Agences d'encadrement et de paiement - TMNC	146 079,35	80 499,09	65 580,25	146 079,35	80 499,09	65 580,25	
Fournitures, travaux, services TMNC	146 055,01	115 001,72	31 053,29	146 055,01	115 001,72	31 053,29	
2.0 Fonds de soutien	0,00	256 955,38	-256 955,38	0,00	256 955,38	-256 955,38	
Fonds de soutien	0,00	255 685,04	-255 685,04	0,00	255 685,04	-255 685,04	
Frais de transfert fonds de soutien	0,00	1 270,34	-1 270,34	0,00	1 270,34	-1 270,34	
2.1 Appui nutritionnel	22 916,67		22 916,67	22 916,67		22 916,67	
Appui nutritionnel	22 916,67		22 916,67	22 916,67		22 916,67	
2.2 TMNC Réponses COVID 19	10 550 004,89	4 727 609,92	5 822 394,97	10 550 004,89	4 727 609,92	5 822 394,97	
Transfert en espèces au bénéficiaires - TMNC COVID 19	9 761 111,11	4 411 674,46	5 349 436,65	9 761 111,11	4 411 674,46	5 349 436,65	
Prestation des Agences de paiement - TMNC COVID 19	292 833,33	78 057,25	214 776,09	292 833,33	78 057,25	214 776,09	
Fournitures, travaux, services TMNC COVID 19	496 060,44	237 878,21	258 182,23	496 060,44	237 878,21	258 182,23	
2. Renforcement de la capacité institutionnelle FID	3 548 402,97	2 625 079,31	923 323,67	3 548 402,97	2 625 079,31	923 323,67	
Assistances techniques	294 938,47	17 569,66	277 368,81	294 938,47	17 569,66	277 368,81	
Investissement	638 101,99	416 085,45	222 016,54	638 101,99	416 085,45	222 016,54	
Coût de management du Projet	2 564 045,68	2 180 670,14	383 375,53	2 564 045,68	2 180 670,14	383 375,53	
Investissement COVID 19	13 333,33	1 168,14	12 165,19	13 333,33	1 168,14	12 165,19	
Coût de management du Projet COVID 19	37 983,50	9 585,92	28 397,58	37 983,50	9 585,92	28 397,58	
Total	30 793 372,12	18 559 657,44	12 233 714,68	30 793 372,12	18 559 657,44	12 233 714,68	

UTILISATION DES FONDS PAR CATÉGORIE ET TYPE DE DÉPENSE (MODÈLE III)

Filets Sociaux de Sécurité - Financement Additionnel 2							
Fonds d'Intervention pour le Développement							
UTILISATION DES FONDS PAR CATÉGORIE ET TYPE DE DÉPENSE (MODÈLE III)							
Modèle : 2							
Exercice 2020							
Semestre finissant le 30/06/2020							
ARIARY (MGA)							
Composantes et Activités de l'Entité	Semestre			Cumulatif			Doc.D'éval. de l'Entité
	Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart	Durée de vie
Filets sociaux de sécurité(11+12+15)	98 193 007 881,66	59 141 939 757,21	39 051 068 124,45	98 193 007 881,66	59 141 939 757,21	39 051 068 124,45	
1.1 Argent Contre Travail Productif (ACT-P)	13 266 046 506,99	9 309 963 078,11	3 956 083 428,88	13 266 046 506,99	9 309 963 078,11	3 956 083 428,88	
Transfert en espèces aux bénéficiaires	6 204 564 000,00	4 917 401 000,00	1 287 163 000,00	6 204 564 000,00	4 917 401 000,00	1 287 163 000,00	
Frais de service des Agences de paiement	471 149 581,81	336 322 046,23	134 827 535,58	471 149 581,81	336 322 046,23	134 827 535,58	
Fournitures, travaux, services ACTP	6 590 332 925,18	4 056 240 031,88	2 534 092 893,30	6 590 332 925,18	4 056 240 031,88	2 534 092 893,30	
1.2 TMDH + FR(13+14)	33 060 398 440,50	21 858 855 385,33	11 201 543 055,17	33 060 398 440,50	21 858 855 385,33	11 201 543 055,17	
1.3 Transfert Monétaire pour le Développement Humain (TMDH)	33 060 398 440,50	21 858 855 385,33	11 201 543 055,17	33 060 398 440,50	21 858 855 385,33	11 201 543 055,17	
Transfert Monétaire Conditionnel	23 158 240 000,00	18 507 550 000,00	4 650 690 000,00	23 158 240 000,00	18 507 550 000,00	4 650 690 000,00	

Frais de service des agences de paiement	1 583 349 043,37	1 000 526 319,92	582 822 723,45	1 583 349 043,37	1 000 526 319,92	582 822 723,45
Fournitures, travaux, services TMDH	8 318 809 397,13	2 350 779 065,41	5 968 030 331,72	8 318 809 397,13	2 350 779 065,41	5 968 030 331,72
1.4 Fonds de redressement	0,00		0,00	0,00		0,00
Transfert Fonds de redressement	0,00		0,00	0,00		0,00
Frais de transfert FR	0,00		0,00	0,00		0,00
Encadrement et accompagnement FR	0,00		0,00	0,00		0,00
Réponses aux crises(16+17+18+21+22)	51 866 562 934,17	27 973 121 293,77	23 893 441 640,40	51 866 562 934,17	27 973 121 293,77	23 893 441 640,40
1.6 ACT Post Catastrophes	2 059 958 279,98	1 311 507 999,98	748 450 280,00	2 059 958 279,98	1 311 507 999,98	748 450 280,00
Rémunération des travailleurs	1 199 135 000,00	740 900 000,00	458 235 000,00	1 199 135 000,00	740 900 000,00	458 235 000,00
Frais d'encadrement AGEX	193 643 250,00	105 950 050,00	87 693 200,00	193 643 250,00	105 950 050,00	87 693 200,00
Matériels et matériaux	224 922 029,98	138 447 749,98	86 474 280,00	224 922 029,98	138 447 749,98	86 474 280,00
Equipement de Protection Individuelle (EPI)	374 230 000,00	278 510 800,00	95 719 200,00	374 230 000,00	278 510 800,00	95 719 200,00
Coût EMS ACT POST CATA	64 015 000,00	44 570 000,00	19 445 000,00	64 015 000,00	44 570 000,00	19 445 000,00
SES Post Cata ACT	4 013 000,00	3 129 400,00	883 600,00	4 013 000,00	3 129 400,00	883 600,00
1.7 Réhabilitation/Reconstruction Post Cata	170 260 000,00	15 220 000,00	155 040 000,00	170 260 000,00	15 220 000,00	155 040 000,00
Maîtrise d'Œuvre	146 880 000,00		146 880 000,00	146 880 000,00		146 880 000,00
Travaux	15 220 000,00	15 220 000,00	0,00	15 220 000,00	15 220 000,00	0,00
Coût EMS Infra Post cata	6 660 000,00		6 660 000,00	6 660 000,00		6 660 000,00
SES Post cata INFRA	1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00
1.8 TMNC + FS(19+20)	11 573 827 054,19	8 873 025 085,67	2 700 801 968,52	11 573 827 054,19	8 873 025 085,67	2 700 801 968,52
1.9 TMNC	11 573 827 054,19	7 894 025 085,67	3 679 801 968,52	11 573 827 054,19	7 894 025 085,67	3 679 801 968,52
Transfert en espèces au bénéficiaires - TMNC	10 519 571 000,00	7 171 040 000,00	3 348 531 000,00	10 519 571 000,00	7 171 040 000,00	3 348 531 000,00
Prestation des Agences d'encadrement et de paiement - TMNC	526 735 563,86	297 554 838,67	229 180 725,19	526 735 563,86	297 554 838,67	229 180 725,19
Fournitures, travaux, services TMNC	527 520 490,33	425 430 247,00	102 090 243,33	527 520 490,33	425 430 247,00	102 090 243,33
2.0 Fonds de soutien	0,00	979 000 000,00	-979 000 000,00	0,00	979 000 000,00	-979 000 000,00
Fonds de soutien	0,00	974 160 000,00	-974 160 000,00	0,00	974 160 000,00	-974 160 000,00
Frais de transfert fonds de soutien	0,00	4 840 000,00	-4 840 000,00	0,00	4 840 000,00	-4 840 000,00
2.1 Appui nutritionnel	82 500 000,00		82 500 000,00	82 500 000,00		82 500 000,00
Appui nutritionnel	82 500 000,00		82 500 000,00	82 500 000,00		82 500 000,00
2.2 TMNC Réponses COVID 19	37 980 017 600,00	17 773 368 208,12	20 206 649 391,88	37 980 017 600,00	17 773 368 208,12	20 206 649 391,88
Transfert en espèces au bénéficiaires - TMNC COVID 19	35 140 000 000,00	16 618 342 000,00	18 521 658 000,00	35 140 000 000,00	16 618 342 000,00	18 521 658 000,00
Prestation des Agences de paiement - TMNC COVID 19	1 054 200 000,00	284 932 490,00	769 267 510,00	1 054 200 000,00	284 932 490,00	769 267 510,00
Fournitures, travaux, services TMNC COVID 19	1 785 817 600,00	870 093 718,12	915 723 881,88	1 785 817 600,00	870 093 718,12	915 723 881,88
2. Renforcement de la capacité institutionnelle FID	12 855 662 223,12	9 676 922 084,24	3 178 740 138,88	12 855 662 223,12	9 676 922 084,24	3 178 740 138,88
Assistances techniques	1 060 124 028,00	61 595 028,00	998 529 000,00	1 060 124 028,00	61 595 028,00	998 529 000,00
Investissement	2 326 659 736,42	1 527 519 761,71	799 139 974,71	2 326 659 736,42	1 527 519 761,71	799 139 974,71
Coût de management du Projet	9 284 137 858,70	8 047 982 278,53	1 236 155 580,17	9 284 137 858,70	8 047 982 278,53	1 236 155 580,17
Investissement COVID 19	48 000 000,00	4 219 200,00	43 780 800,00	48 000 000,00	4 219 200,00	43 780 800,00
Coût de management du Projet COVID 19	136 740 600,00	35 605 816,00	101 134 784,00	136 740 600,00	35 605 816,00	101 134 784,00
Total	111 048 670 104,78	68 818 861 841,45	42 229 808 263,33	111 048 670 104,78	68 818 861 841,45	42 229 808 263,33

Tableau 3 : Tableau d'avancement physique des activités

Filets Sociaux de Sécurité - Financement Additionnel 2								
Fonds d'Intervention pour le Développement								
Rapport sur l'avancement physique des activités (Modèle I - Partie 1)								
Exercice 2020								
Au 30/06/2020								
DOLLAR(1 USD = 1 MGA)								
Page 1/1								
Code	Activités et Réalisation de l'Entité	Total pour la durée de l'Entité		Cumul à ce jour		Pourcentage		COMMENTAIRES
		Quantités à Réaliser	Coûts totaux	Quantités Réalisées	Coûts totaux	Quantités Réalisées	Coûts totaux	
1	Filets de sécurité pour les pauvres	593 627,00	72 529 310,60	373 391,00	15 934 578,13	63%	21,97%	
	1a -Argent Contre Travail Productif (ACT-P)	36 000	17 798 335,65	33 450	2 512 140,96	93%	14,11%	quantité=Nombre ménages bénéficiaires
	1a -Transfert Monétaire pour le Dévelop Humain	106 000	32 324 457,29	106 320	5 934 302,05	100%	18,36%	quantité=Nombre ménages bénéficiaires
	1d -Fonds de redressement (FR)	65 000	4 165 329,05			0%	0,00%	quantité=Nombre ménages bénéficiaires
	1b -ACT Post catastrophes	119 000	925 096,31	67 250	363 758,06	57%	39,32%	quantité=Nombre ménages bénéficiaires
	1b -Réhabilitation et reconstruction des infra	42	2 235 000,00		4 192,84	0%	0,19%	quantité=nombre infrastructures réhabilitées et/ou reconstruites
	1c - Transfert Monétaire Non Conditionnel	63 000	3 535 805,08		2 392 574,31	0%	67,67%	quantité=Nombre ménages bénéficiaires
	1c - Transfert Monétaire Non Conditionnel COVID 19	204 584	10 601 321,72	166 370	4 727 609,92	81%	44,59%	quantité=Nombre ménages bénéficiaires
	2 - Appui Nutritionnel	1	943 965,50	1		100%	0,00%	
2	Renforcement de la capacité institutionnelle de l'administra	fft	13 970 689,40	fft	2 625 079,31	fft	18,80%	
	2 - Renforcement de la Capacité Institutionnelle	fft	10 307 905,36	fft	2 614 325,25	fft	24,96%	
	2 - Renforcement de la Capacité Institutionnelle - COVID 19	fft	62 784,04	fft	10 754,06	fft	17,13%	
	Total Général	593 627,00	86 500 000,00	373 391,00	18 559 657,44	63%	15,65%	

Rapport sur l'avancement physique des activités (Modèle I - Partie 1)

Exercice 2020

Au 30/06/2020

ARIARY

Code	Activités et Réalisation de l'Entité	Total pour la durée de l'Entité		Cumul à ce jour		Pourcentage		COMMENTAIRES
		Quantités à Réaliser	Coûts totaux	Quantités Réalisées	Coûts totaux	Quantités Réalisées	Coûts totaux	
1	Filets de sécurité pour les pauvres	593 627,00	261 105 518 174,61	373 391,00	59 141 939 757,21	63%	22,65%	
	1a -Argent Contre Travail Productif (ACT-P)	36 000	64 074 008 336,92	33 450	9 309 963 078,11	93%	14,53%	quantité=Nombre ménages bénéficiaires
	1a -Transfert Monétaire pour le Dévelop Humain	106 000	116 368 046 237,72	106 320	21 858 855 385,33	100%	18,78%	quantité=Nombre ménages bénéficiaires
	1d -Fonds de redressement (FR)	65 000	14 995 184 590,69			0%	0,00%	quantité=Nombre ménages bénéficiaires
	1b -ACT Post catastrophes	119 000	3 330 346 709,47	67 250	1 311 507 999,98	57%	39,38%	quantité=Nombre ménages bénéficiaires
	1b -Réhabilitation et reconstruction des infra	42	8 046 000 000,00		15 220 000,00	0%	0,19%	quantité=nombre infrastructures réhabilitées et/ou reconstruites
	1c - Transfert Monétaire Non Conditionnel	63 000	12 728 898 300,80		8 873 025 085,67	0%	69,71%	quantité=Nombre ménages bénéficiaires
	1c - Transfert Monétaire Non Conditionnel COVID 19	204 584	38 164 758 200,00	166 370	17 773 368 208,12	81%	46,57%	quantité=Nombre ménages bénéficiaires
	2 - Appui Nutritionnel	1	3 398 275 799,01	1		100%	0,00%	
2	Renforcement de la capacité institutionnelle de l'administra	fft	50 294 481 825,39	fft	9 676 922 084,24	fft	19,24%	
	2 - Renforcement de la Capacité Institutionnelle	fft	37 108 459 299,30	fft	9 480 825 308,69	fft	25,55%	
	2 - Renforcement de la Capacité Institutionnelle - COVID 19	fft	226 022 526,09	fft	39 825 016,00	fft	17,62%	
	2 -Coûts d'Administration Post cata	fft	12 960 000 000,00	fft	156 271 759,55	fft	1,21%	
	Total Général	593 627,00	311 400 000 000,00	373 391,00	68 818 861 841,45	63%	22,10%	

C. SITUATION DE LA PASSATION DE MARCHES

Tableau 4 : Tableau de suivi de passation de marchés

Les détails de la situation présentée ici sont annexés au présent document.

Situation consolidée des marchés jusqu'au 30 juin 2020				
	TOTAL NB CONTRATS PREVUS	TOTAL NB CONTRATS SIGNES	POURCENTAGE	Observations
Consultants Individuels	49	48	98%	
Agences d'exécution PC	41	41	100%	
Agences de Ciblage	2	1	50%	Le deuxième contrat a été signé début juillet 2020 (Arivonimamo)
Agences de Planification	7	7	100%	
Agence d'encadrement	37	37	100%	
SOUS TOTAL CONSULTANTS	136	134	99%	
Fournitures de biens	15	6	40%	Ecart dû en grande partie à la situation d'urgence qui prévaut dans le Pays notamment l'indisponibilité en plein temps du personnel (membres du comité d'évaluation et commission d'appel d'offres) d'une part et à l'obligation de travailler en ligne d'autre part.
Travaux	1	1	100%	
Prestations de services non intellectuels	53	52	98%	
SOUS TOTAL MARCHES BIENS TRAVAUX ET SERVICES	69	59	86%	
TOTAL	205	193	94%	

NB : Les détails concernant la passation de marché sont présentés en annexes

D. SITUATION DES INDICATEURS

La situation cumulée des indicateurs au 30 juin 2020 reflétant les résultats relatifs à la mise en œuvre du projet FSS se présentent comme suit

Indicateurs de l'objectif de développement du projet				
N°	Désignation de l'indicateur	Prévision fin projet	Situation cumulée au 30 juin 2020	Observation
Indicateurs de résultats				
1	Bénéficiaires directs du projet (Nombre d'individus)	950 000	1 493 245	1 493 245= nombre de ménages bénéficiaires sur MIS *5
2	Femmes bénéficiaires (Pourcentage)	65	79%	Numérateur : 149 715 (nombre des femmes récepteurs) Dénominateur : 190 065 (nombre total des récepteurs)
3	Pourcentage des bénéficiaires des programmes de filet de sécurité (TMDH, FSP) issus des 30% les plus pauvres de la population (Pourcentage)	70	81	Draft du rapport final du consultant statisticien de la BM (présentation durant la mission de supervision le 10 novembre 2019)
4	Pourcentage des enfants en âge d'être scolarisés au primaire issus de familles bénéficiaires des TMDH et qui fréquentent l'école au moins 80% du temps de classes. (Pourcentage)	80	82%	34 670/42 324 enfants (situation coresponsabilité période Février - Mars 2020) La rentrée scolaire était le 28 octobre 2019 (Année scolaire 2019-2020). Certain ménage (de l'ordre de 10%) des ménages bénéficiaires affronte difficilement la période de soudure et facteur aggravant, ces ménages n'ont pas reçu les allocations des mois octobre et décembre 2019, période de transition vers FA2. Ceci montre qu'il y a encore un pourcentage sensible des bénéficiaires qui s'appuie sur les transferts pour envoyer leurs enfants à l'école.
Indicateurs de résultats intermédiaires				
5	Bénéficiaires des programmes de filet de sécurité (nombre ménages)	190 000	190 065	Ménage bénéficiaires TMDH+ ménage bénéficiaires FSP et ménages bénéficiaires ACT POST CATA
6	Bénéficiaires des programmes de filet de sécurité – Transferts monétaires conditionnels (nombre ménages)	106 900	106 320	nombre ménage TMDH: 39 727 et TMDH SUD: 66 593 (MIS 31/05/2020)

7	Bénéficiaires des programmes de filet de sécurité – Femmes (nombre ménages)	133 000	149 715	TMDH: 35 323 (MIS 31/05/2020) TMDH SUD : 65 176 (MIS 31/05/2020) FSP: 15 121 (MIS 31/05/2020) post cata: 34 095 (source BDD) Total: 149 715
8	Bénéficiaires des programmes de filet de sécurité – Argent contre travail, vivres-contre-travail et travaux publics (nombre ménages)	36 000	33 450	FSP: 33 450 ménages (MIS 31/05/2020)
9	Nombre de plans de gestion du paysage élaborés de manière participative (Nombre)	67	71	
10	Surface « traitée » en appliquant les mesures de CSE (Hectare (Ha))	1 680	1 360	
11	Surface (re)boisée dans le cadre des activités de filet de sécurité productif (Hectare (Ha))	1 000	1 477	Le rendement réel des travailleurs dépasse le rendement prévisionnel estimé et considéré dans la planification malgré la considération des caractéristiques des bénéficiaires lors de la planification (rendement d'un chantier en HIMO, dont les travailleurs sont en majorité des femmes, vulnérables et ayant faim). A Ankazoabo, les bénéficiaires ont pris l'initiative de planter plus d'arbres pour leurs intérêts. Quant à Isandra, les jeunes plants produits par les pépinières de l'intervention 2 étaient déjà disponibles pour le reboisement.
12	Nombre de jours d'emploi générés dans le cadre du FSP et des activités d'argent contre travail d'intervention en cas de catastrophes (Nombre)	12 000 000	6 731 205	Réalisations techniques : 295 activités ACT post cata créant 489 705 personnes-jours d'emplois, 1 633 chantiers FSP réceptionnés créant 6 241 500 personnes-jours d'emplois Causes d'écarts: absence de certains ménages pendant les travaux a des impacts sur le comptage de la personne-jour de travail
13	Pourcentage des biens communautaires maintenus un an après leur achèvement (Pourcentage)	80	89	Nombre bien communautaires maintenus un an après leur achèvement/nombre total bien communautaires un an après leur achèvement

14	Bénéficiaires des programmes de filet de sécurité – Argent contre travail, vivres-contre-travail et travaux publics post catastrophes (nombre ménages)	119 000	50 295	Post cata : 50 295 (Source BDD)
15	Pourcentage des plaintes enregistrées qui ont été traitées par le FID (Pourcentage)	90	99%	Dénominateur: 18 598 (Nombre des Plaintes reçues) Numérateur: 18 346 (Nombre des Plaintes traitées) Nb: Les plaintes relatives au TMNC TOSIKA FAMENO ne sont pas incluses dans cet indicateur (55 030 reçues et 31 046 traitées)
16	Coûts de fonctionnement du FID exprimés en pourcentage des dépenses d'exécution du programme (Pourcentage)	16,20	13,39	

E. PERSPECTIVES POUR LA PROCHAINE PERIODE : JUILLET A DECEMBRE 2020

Les perspectives pour le 2ème semestre 2020 seront focalisées sur la continuation de la mise en œuvre des activités planifiées dans le PTBS (période juillet à décembre 2020) ainsi que l'achèvement du paiement des transferts monétaires non conditionnels (TMNC) en réponse du COVID-19 « TOSIKA FAMENO ».

Notons toutes fois que les activités et les calendriers prévus pour cette période pourraient être reportées et/ou réorganisées au fur et à mesure de l'évolution de la situation de la pandémie COVID-19 à Madagascar.

NB : Les détails des activités planifiées ainsi que le calendrier prévisionnel sont présentés dans le PTBS juillet à décembre 2020 ayant reçu l'avis de non objection de la Banque mondiale en date 07 juillet 2020.

I. Programme filet de sécurité productif (FSP)

Perspectives	Echéance
Anciens districts	
Achèvement des paiements de la dernière tranche de salaires des bénéficiaires relatifs aux travaux de l'intervention n° 8	Juillet 2020
Planification pour les trois (03) interventions restantes	En continu
Préparation et mise en œuvre des activités MACC au niveau des sites	En continu
Mise en œuvre des travaux relatifs à l'intervention n° 9	A partir du mois de septembre
Nouveaux districts	
Finalisation planification, ciblage et enregistrement des bénéficiaires	Juillet 2020
Démarrage effectif des travaux relatifs à la première et au deuxième intervention avec organisation du lancement officiel « Tsatok'angady »	Aout 2020

Activités communes pour les anciens et nouveaux districts.

Localisation géographique des sites. La fourniture des coordonnées GPS des chantiers FSP fait partie des prestations des Agences de planification et ne demande aucun budget supplémentaire. Ces coordonnées seront disponibles une fois que les plans soient établis. Toutefois, ces coordonnées se pourraient collecter durant les missions de supervision sur terrain si besoin est. Notons que cette activité entre dans la cartographie des interventions de la Banque mondiale en utilisant la méthode Geo-Enabling for Monitoring and Supervision (GEMS).

Mesures d'accompagnement. Préparation et mise en œuvre des activités de mesures d'accompagnement aux niveaux des sites FSP notamment le recrutement des accompagnateurs spécialisés (1000 ménages par accompagnateur spécialisé) et la mise en place et opérationnalisation des relais communautaires qui vont épauler les accompagnateurs spécialisés (1 relais communautaires par terroir).

Dans le cadre de la mise en œuvre, des renforcements de capacités, des sensibilisations et des activités sur des divers thématiques liées à l'hygiène, l'alimentation des jeunes enfants, le développement de l'enfant, l'augmentation de la probabilité de la pratique du planning familial et bien d'autres seront dispensées au niveau des ménages bénéficiaires tout au long de la mise en œuvre dudit programme.

Comme stipulé dans le manuel de procédure MACC du FSP, une visite de site sera réalisée une fois par intervention. Il s'agit d'un événement à organiser en même temps ou du moins à la même période que la foire « Tsenabe Mirindra ». La visite de site permettra à la communauté locale de s'acquérir des expériences et savoir-faire des bénéficiaires FSP, notamment sur les pratiques agricoles adaptées au changement climatique. L'organisation des visites de sites se fera en collaboration avec les leaders des Groupes de travail concernés à savoir les ML, les membres du bureau des CGE et les membres du bureau des AVEC, sous l'encadrement des Accompagnateurs spécialisés et bien évidemment sous la supervision des chargés de projet du FID. Bien que les Espaces productifs des FSP soient toujours ouvert au public à chaque intervention, cette session de partage « Visite de site » est dédiée à la population locale afin de vulgariser et de renforcer l'adoption des changements de comportement positif au sein de la communauté.

Inclusion Economique : Les activités prévues pour la période consistent à la mise en relation des bénéficiaires avec les professionnels agricoles précédée par des séances de renforcements de capacités des bénéficiaires sur les thèmes liées aux chaînes de valeur. Entre autres, des renforcements de capacités sur la mutation des CGE en coopérative (procédures administratives et leadership associatif) suivi de la maîtrise du marché (formation visant à renforcer les capacités des paysans leaders à gérer leur coopérative, à négocier des contrats, et à prospecter des débouchés) seront dispensés à l'endroit des bénéficiaires avant cette mise en relation.

Cf MDP MACC mai 2020 approuvé_p16

L'Inclusion Productive apportera un soutien différencié en fonction du stade de développement de chaque ménage, de la stabilisation de la consommation à la diversification des actifs ou des Activités Génératrices de Revenus (AGR) des ménages et à la production de cultures commerciales, à l'inclusion dans la chaîne de valeur.

- *Le renforcement de capacité des membres des comités/coopératives pour assurer leur maîtrise du marché par :*
 - *Les formations en technique de négociation*
 - *La recherche de débouchés*
 - *L'autonomisation des comités/coopératives afin d'éviter les intermédiaires*

Développement et Bien Être de la Famille (EBE). Les activités juillet à décembre portent sur :

- Mise en place des espaces physiques et établissement contrat foncier y afférent.
- Education parentale sur DPEI, PFE (en référence aux PFE prioritaires) et IP (inter intervention)
- La sensibilisation sur les activités non concernées par le baseline et les ateliers et autres que les PFE, à savoir : l'éducation environnementale, la gouvernance citoyenne, l'éducation

nutritionnelle de la famille, la sensibilisation contre l'IST/SIDA, initiation des enfants à l'agriculture (potager, pépinière, ...), le Planning Familial, la santé publique, la Santé Reproductrice des Adolescents (SRA), la lutte contre la Violence Basé sur le Genre (VBG), l'exploitation et travail des enfants, la tenure foncière la couverture santé.

II. Transfert Monétaire pour le Développement humain (TMDH) et Fonds de Redressement (FR) y compris FIAVOTA :

Activités	Echéance
Finalisation du paiement du transfert Juin 2020	Juillet 2020
Paiement du transfert Août 2020	Août 2020
Supervision des SOCOP	En continu
Mise en œuvre des activités MACC	Une fois l'état d'urgence levé
Recertification à Betafo: publication des résultats des bénéficiaires recertifiés à l'issue de la modélisation.	Juillet 2020

Localisation géographique des sites EBE Les coordonnées GPS des sites EBE seront collectées durant les démarrages effectifs des activités et/ou durant les missions de supervision sur terrain. Notons que cette activité entre dans la cartographie des interventions de la Banque mondiale en utilisant la méthode Geo-Enabling for Monitoring and Supervision (GEMS).

III. Réponse pour un relèvement précoce après catastrophes naturelles

Perspectives	Echéance
ARGENT CONTRE TRAVAIL	
En fonction des besoins face aux catastrophes naturelles survenues (insécurité alimentaire aigüe, cyclones, inondations, sécheresse...), des activités ACT seront réalisées dans les zones affectées selon le degré des sinistres déclarées par le BNGRC.	
REHABILITATION/RECONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES	
Evaluation des offres et Contractualisation des bureaux d'études pour les 20 infrastructures	Fin Juillet 2020
Etudes des 20 infrastructures	Aout 2020
Passation de marchés pour le recrutement des MPE et démarrage des travaux	A partir Octobre 2020
PROGRAMME DE PROTECTION SOCIALE RÉACTIVE AUX CHOCS	
Achèvement des 4e transferts TMNC pour les communes restantes	Début juillet 2020
Achèvement du 2e transferts TMNC en réponse du COVID 19 pour les bénéficiaires dans toutes les communes restantes	Juillet-Aout 2020
Paiement de Fonds de Soutien (FS) pour les ménages extension horizontale.	A partir du Juillet 2020
Paiement de Fonds de Redressement (FR) pour les ménages FIAVOTA.	

IV. Sauvegarde sociale et environnementale (toutes composantes confondues)

Les activités suivantes sont programmées au cours de la période :

d-1) Toutes sous-composantes confondues :

- Le recyclage des chauffeurs de la Direction Générale en matière de la sécurité routière
- La réalisation de la formation en secourisme et en sécurité pour la Direction de Fort Dauphin et la Direction Générale,
- La mise en place des panneaux d'indication de sortie de secours lumineux et des matériels de secours au niveau de la DIRGEN,
- L'accompagnement des missionnaires du FID par les éléments de la gendarmerie,
- La mise à la disposition au niveau des sites de paiement et des EBE, des boîtes à pharmacie,
- La réalisation d'une séance de formation du personnel en VIH/SIDA 2ème vague,
- La mise en place des unités de dépistage mobiles de VIH/SIDA,
- La réalisation de 07 séances de la formation en Violence Basée sur le Genre (VBG),
- L'information des partenaires du FID sur l'importance du VBG,
- L'ajout de message de lutte sur la VBG à tous les panneaux de chantier
- La réalisation d'un atelier de capitalisation sur "sécurité contre le banditisme"

d-2) FSP :

- Dotation de kits complets d'EPI, prise en charge des accidents des bénéficiaires, mise à disposition de l'eau potable, du savon, de latrines et de fosses à ordures, élaboration du PAG

d-3) MACC et FR :

- Elaboration des contrats fonciers, mise en place d'un dispositif de lavage des mains, des fosses/bacs à ordures avec tri des déchets, d'une latrine conforme, formation sur et sensibilisation des thématiques suivantes : *Gestion des déchets, Lutte contre la déforestation, Lutte contre les feux, Changement climatique, Violence basée sur le genre (VBG), Exploitation/violence et travail des enfants, Lutte contre VIH SIDA, Sécurité, Confection de masques de protection COVID et Sécurisation foncière*, élaboration des supports de sensibilisation SES MACC y afférents.

d-4) ACT – Post catastrophe :

- Dotation de kits d'EPI complets, prise en charge des accidents des bénéficiaires, mise à disposition de l'eau potable, du désinfectant, du savon, de latrines et de la garderie.

V. Gouvernance Citoyenne (toutes composantes confondues)

Les activités suivantes sont programmées au cours de la période :

- Le renforcement de capacité et l'appui des CPS en matière de gestion des plaintes ;
- Le traitement des plaintes et cas spéciaux ;
- La mise en œuvre et le suivi des séances de suivi évaluation communautaire ;
- Le renforcement de la sensibilisation des prestataires, des autorités locales et de la communauté sur le mécanisme de gestion des plaintes et sur la lutte contre la corruption ;
- La mise en place et la mise en œuvre du plan d'action anti-corruption ;
- Le renforcement du suivi des personnels de terrain (prestataires et équipe du FID) en vue de l'amélioration de la gouvernance et de la mise en œuvre du programme.

VI. Communication

Les activités suivantes sont programmées au cours de la période :

- Le renouvellement et/ou développement, la production des supports de communication pour soutenir la visibilité du FID et des programmes mis en œuvre : oriflammes, banderoles, fanions, parasols ; dépliants, goodies, amélioration de l'accueil du FID ;
- Le renforcement de la communication auprès du gouvernement, des autorités locales et des partenaires : développement et pose d'affiches avec cadre dans les locaux des ministères et partenaires locaux ;
- Pour les relations avec la presse : la rencontre thématique régulière avec la presse, voyages de presse ;

Activités	juil-20	août-20	sept-20	oct-20	nov-20	déc-20
La réalisation d'une conférence de presse thématique: "Vulnérabilité et protection sociale" Objectifs: Développement de 10 articles/reportages sur le thème suite à l'information de 10 organes de presse						
La réalisation de 02 ateliers presses Manakara / Toliary "Sensibilisation à la protection sociale" Objectifs: Information de 10 organes de presse par direction Sensibilisation de 10 journalistes locaux à la protection sociale						
La réalisation d'un atelier presse Antananarivo / Participation Equipe BM / Sensibilisation à la protection sociale Objectifs : Information de 10 organes de presse par direction Sensibilisation de 10 journalistes locaux à la protection sociale						
La réalisation d'un Study Tour à Manakara sur "Asa Avotra Mirindra" Objectifs : Développement de 05 grands reportages dans 05 organes de presse d'Antananarivo						
La réalisation d'un Study Tour Betafo sur "Vatsin'Ankohonana" Objectifs : Développement de 05 grands reportages dans 05 organes de presse d'Antananarivo						

- Le renforcement de la communication médiatique : insertion presse thématique, diffusion d'émissions et de productions audio et audiovisuelles ;
- La réalisation de vidéos globales sur les programmes et de vidéos thématiques sur les mesures d'accompagnement avec les histoires de succès pour faire connaître les programmes ;

- L'édition du bulletin d'information sur les activités du FID ;
- La mise à jour des plateformes digitales : site web, réseaux sociaux ;
- L'appui aux activités des composantes et à la communication opérationnelle ;
- L'appui à la réalisation ou à la participation d'évènements ;
- L'alimentation des banques d'images par la couverture des différents événements et activités importantes ;
- La réalisation du « study tour » à Manakara, Antanifotsy et Betafo.
- La préparation et l'édition des « goodies » pour l'année 2021 du FID (calendriers, agendas...).

VII. Renforcement de la capacité institutionnelle de l'administration des filets sociaux et suivi

Les activités à réaliser par rubrique sont :

g-1) Assistance technique.

- La mise à jour et amélioration du système d'information MIS. Il est programmé au cours de cette période la contractualisation du cabinet en charge du MIS sur la maintenance dudit logiciel ;
- La maintenance du logiciel TOM2PRO ;
- Les frais des consultants pour la réalisation des différentes études et analyses à savoir :
Le Consultant Individuel en charge de l'étude de la sécurité informatique du FID, le Consultant Individuel en charge de l'étude de la mise en place du nouveau système de paiement (d'ici octobre 2020, les perspectives envisagées sont basées sur le paiement électronique par Paositra Money dans les zones non couvertes par un réseau mobile et paiement par mobile money dans les zones couvertes par un réseau mobile) et le Consultant Individuel en charge de l'étude du système de gestion des véhicules.
- Suivi Evaluation :
Dans le cadre de la valorisation et d'exploitation des données dans le MIS, deux études sont planifiées au cours de la période:
 1. Finalisation de l'analyse de la contribution des projets FSS au développement humain (analyse déjà en cours) ;
 2. Etude des évolutions du PMT des bénéficiaires FSS : il s'agit d'une comparaison de la variation du PMT entre deux dates différentes pour apprécier les évolutions
 La continuation du suivi des recommandations de la dernière mission de supervision au cours de la période, des missions des auditeurs internes tous les semestres et des différents études/analyses disponibles fait partie des activités réalisées dans le cadre du suivi évaluation.

g-2) Investissement.

- Le remplacement des matériels informatiques et mobiliers défectueux et l'acquisition de nouveaux matériels et mobiliers pour le personnel nouvellement recruté ;
- Le remplacement des véhicules acquis en 2006 (17 véhicules dont 8 remplacés sur FSS FA 1 et le reste sur FSS FA2), la livraison de la deuxième vague de voiture ;
- L'achat de matériels de communication.

g-3) Management du Projet.

- L'organisation et la réalisation des formations du personnel sur les thèmes prévus dans le planning de formation approuvé par la Banque Mondiale ;
- La réalisation des missions de supervisions des activités ;
- L'organisation et la réalisation des réunions de travail ;
- L'évaluation du personnel suivant la procédure en vigueur ;

- Face aux contraintes liées à Covid 19, le cadre de travail du personnel est révisé prenant en compte les mesures barrières :
 - La désinfection hebdomadaire du bâtiment et des véhicules FID, désinfection journalière des objets les plus touchés par les mains, utilisation de pédiluve (à l'eau de javel) à l'entrée principale du bureau, utilisation de gels désinfectants pour tout le personnel du FID, port de cache bouche obligatoire et prise de température à l'entrée pour tout le personnel
 - L'adoption de la méthode de télétravail suivant l'organisation de chaque Direction. Les quotas de communication et de connexion du personnel ont été révisés à la hausse pendant la période d'urgence sanitaire.
- L'assurance santé pour le personnel du FID.
- La mise en place des antennes régionales

VII - Renforcement de la capacité institutionnelle de l'administration des filets sociaux et suivi

a) Assistance technique.

- La mise à jour et amélioration du système d'information MIS. Il est programmé au cours de cette période la contractualisation du cabinet en charge du MIS sur la maintenance dudit logiciel ;
- La maintenance du logiciel TOM2PRO ;
- Les frais des consultants pour la réalisation des différentes études et analyses à savoir :
Le Consultant Individuel en charge de l'étude de la sécurité informatique du FID, le Consultant Individuel en charge de l'étude de la mise en place du nouveau système de paiement (d'ici octobre 2020, les perspectives envisagées sont basées sur le paiement électronique par Paositra Money dans les zones non couvertes par un réseau mobile et paiement par mobile money dans les zones couvertes par un réseau mobile) et le Consultant Individuel en charge de l'étude du système de gestion des véhicules.
- Suivi Evaluation :
D'abord, dans le cadre de la valorisation et d'exploitation des données dans le MIS, deux études sont planifiées au cours de la période:
 3. Finalisation de l'analyse de la contribution des projets FSS au développement humain (analyse déjà en cours) et ;
 4. L'étude des évolutions du PMT des bénéficiaires FSS : il s'agit d'une comparaison de la variation du PMT entre deux dates différentes pour apprécier les évolutions.

Ensuite, la continuation du suivi des recommandations de la dernière mission de supervision au cours de la période, des missions des auditeurs internes tous les semestres et des différents études/analyses disponibles fait partie des activités réalisées dans le cadre du suivi évaluation.

b) Investissement.

- Le remplacement des matériels informatiques et mobiliers défectueux et l'acquisition de nouveaux matériels et mobiliers pour le personnel nouvellement recruté ;
- Le remplacement des véhicules acquis en 2006 (17 véhicules dont 8 remplacés sur FSS FA 1 et le reste sur FSS FA2), la livraison de la deuxième vague de voiture ;
- L'achat de matériels de communication.

c) Management du Projet.

- L'organisation et la réalisation des formations du personnel sur les thèmes prévus dans le planning de formation approuvé par la Banque Mondiale ;
- La réalisation des missions de supervisions des activités ;
- L'organisation et la réalisation des réunions de travail ;
- L'évaluation du personnel suivant la procédure en vigueur ;
- L'assurance santé pour le personnel du FID.
- La mise en place des antennes régionales
- Face aux contraintes liées à Covid 19, le cadre de travail du personnel est révisé prenant en compte les mesures barrières :
 - ✚ La désinfection hebdomadaire du bâtiment et des véhicules FID, désinfection journalière des objets les plus touchés par les mains, utilisation de pédiluve (à l'eau de javel) à l'entrée principale du bureau, utilisation de gels désinfectants pour tout le personnel du FID, port de cache bouche obligatoire et prise de température à l'entrée pour tout le personnel ;

- ✚ L'adoption de la méthode de télétravail suivant l'organisation de chaque Direction.
Les quotas de communication et de connexion du personnel ont été révisés à la hausse pendant la période d'urgence sanitaire.

CONCLUSION

Durant le premier semestre de l'année 2020, le budget total alloué s'est élevé à **30 844 689 USD** soit **36 %** budget total du programme. Le montant total des dépenses s'est élevé à **18 559 657 USD**. Le taux d'exécution financière a été de **60 %**.

Pour les interventions classiques (FSP, TMDH, ACGPC et INFRA), la plupart des activités planifiées a été réalisée. Cependant, certaines activités ont connues des glissements à cause de la situation d'urgence sanitaire instaurée par l'Etat Malagasy pour faire face à la pandémie du coronavirus depuis le 21 Mars 2020. Toutes fois, ces glissements ne présentes pas de grands risques pour l'atteinte des objectifs fixés dans le PTBA 2020.

Par ailleurs, une intervention d'urgence a été conçu et mise en œuvre à travers la sous composante réponse aux crises du projet FSS depuis le mois d'Avril 2020. C'est un transfert monétaire non conditionnel « Tosika Fameno », destiné aux ménages vulnérables et des catégories de ménages dont les revenus sont coupés à cause du confinement. L'objectif étant d'atténuer/amortir les effets néfastes du confinement pour ces catégories de ménages.

Face à la pandémie COVID-19 et à la situation d'urgence sanitaire y afférente, le FID s'efforcera à rattraper les activités reportées et s'exercera à atteindre l'objectif fixé dans le PTBA durant la prochaine période tout en tenant compte des dispositifs et des mesures de sécurités nécessaires.

ANNEXES :

- Avancement physique des activités au 30 06 20 (en USD et en MGA)
- Sources et utilisations des fonds (modèle I en USD et en MGA)
- Utilisation des fonds par catégorie et type de dépense (modèle III en USD et en MGA)
- Tableau de la situation de la passation des marchés au 30 06 20
